

## 公共下水道雨水貯留施設整備工事の進捗状況について

現在、市内 4 箇所（榎島町目川・小倉町堀池・大久保町旦棕・宇治半白）において、各地域での浸水被害軽減を目指し、雨水貯留施設の整備工事を実施しております。

これら 4 工事における現在までの状況と今後の予定について報告いたします。

### (1) 雨水貯留施設（目川貯留管）整備工事

#### ■ 工事概要

- 工 事 名：雨水貯留施設（目川貯留管）整備工事
- 工 事 場 所：榎島町目川地内
- 受 注 者：村本・玉井特定建設工事共同企業体
- 工 期：令和 2 年 1 月 30 日～令和 7 年 3 月 31 日
- 請負代金額：¥1,159,408,800（税込）
- 工事延長：243.1m（貯留管径：φ3,000 mm、貯留量：1,700 m<sup>3</sup>）
- 進 捗 状 況：96.76m（39 本/100 本中）

#### ■ 現在までの状況について

- 令和 4 年 10 月：第 10 回建設・水道常任委員会  
「令和 4 年 4 月に原因不明の事象により、推進機械が停止したため、原因調査を進めることを報告」
- 令和 5 年 8 月：原因調査のための立坑築造に支障となる水道管・ガス管等、地下埋設物の移設完了
- 令和 5 年 9 月：立坑築造開始

#### ■ 今後の予定

- 令和 6 年 3 月：立坑の掘削完了を予定
- 推進機械停止の原因究明後、推進工事を再開し、早期完成を目指す

## (2) 雨水貯留施設（堀池貯留管）整備工事

### ■ 工事概要

- 工 事 名：雨水貯留施設（堀池貯留管）整備工事
- 工 事 場 所：小倉町堀池地内ほか
- 受 注 者：浅沼組・田中創建特定建設工事共同企業体
- 工 期：令和2年8月7日～令和6年1月31日
- 請負代金額：¥ 1,136,466,100（税込）
- 工事延長：543.8m（貯留管径：φ2,400 mm、貯留量：2,400 m<sup>3</sup>）
- 進捗状況：約 272.8m（112本/223本中）

### ■ 現在までの状況について

- 令和5年6月：第8回建設・水道常任委員会  
「令和5年4月に京都府の流域下水道管と接触し、推進機械が停止したため、今後の整備方法などの検討を進めることを報告」
- 令和5年9月：第11回建設・水道常任委員会  
「事業の早期再開に向け、設計等業務委託を発注することを報告」
- 令和5年10月：設計等業務委託契約

### ■ 今後の予定

- 令和6年5月：設計業務完了予定
- 設計業務完了後、事業の早期再開に向け取り組む

## (3) 雨水貯留施設（西大久保小学校）整備工事

### ■ 工事概要

- 工 事 名：雨水貯留施設（西大久保小学校）整備工事
- 工 事 場 所：大久保町旦椋地内
- 受 注 者：田中創建・t s u j i 特定建設工事共同企業体
- 工 期：令和4年10月20日～令和6年3月29日
- 請負代金額：¥ 569,834,100（税込）
- 工事内容：雨水貯留槽設置（貯留量：3,300 m<sup>3</sup>）

### ■ 現在までの状況について

- 令和5年6月：第8回建設・水道常任委員会  
「残土処分地の選定及び掘削時に埋設されていたガラ等の分別に時間を要したため、工期の延伸を報告」

### ■ 今後の予定

- 令和6年3月：工事完成予定

#### **(4) 雨水貯留施設（半白貯留管）整備工事**

##### ■ 工事概要

- 工 事 名：雨水貯留施設（半白貯留管）整備工事
- 工 事 場 所：宇治半白地内
- 工 事 延 長：約 460m（貯留管径：φ 2,800 mm、貯留量：2,800 m<sup>3</sup>）

##### ■ 現在の状況について


- 立坑築造に支障となる水道管・ガス管等の地下埋設物の移設工事を実施中

##### ■ 今後の予定


- 令和 6 年 3 月：水道管・ガス管等の地下埋設物の移設完了予定
- 令和 6 年 4 月：本工事を発注予定（工事期間 約 3 年）

位置図


雨水貯留施設（目川貯留管）整備工事

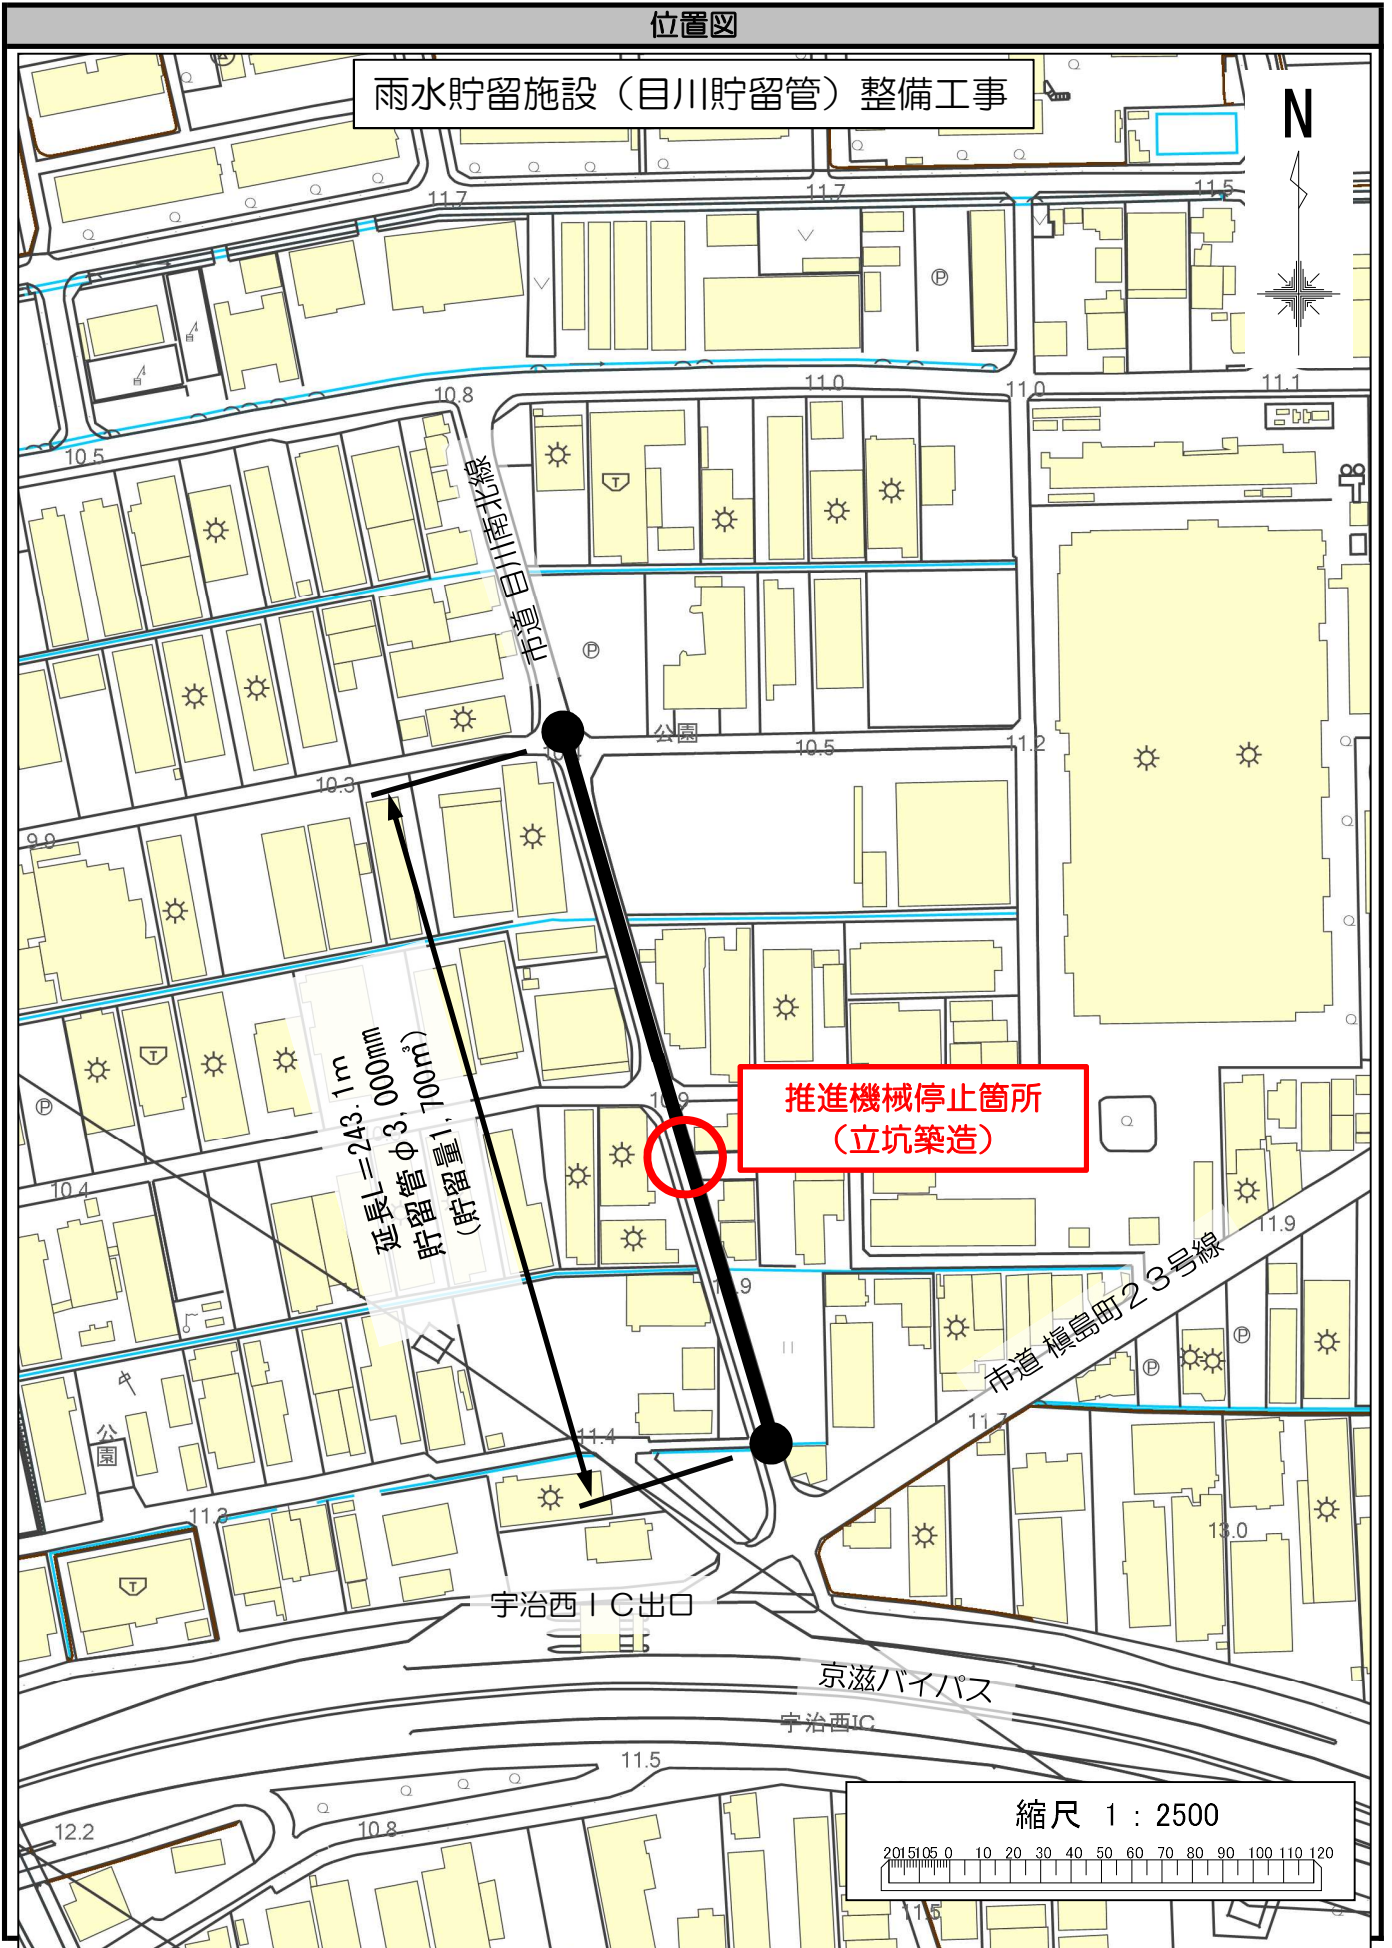

位置図

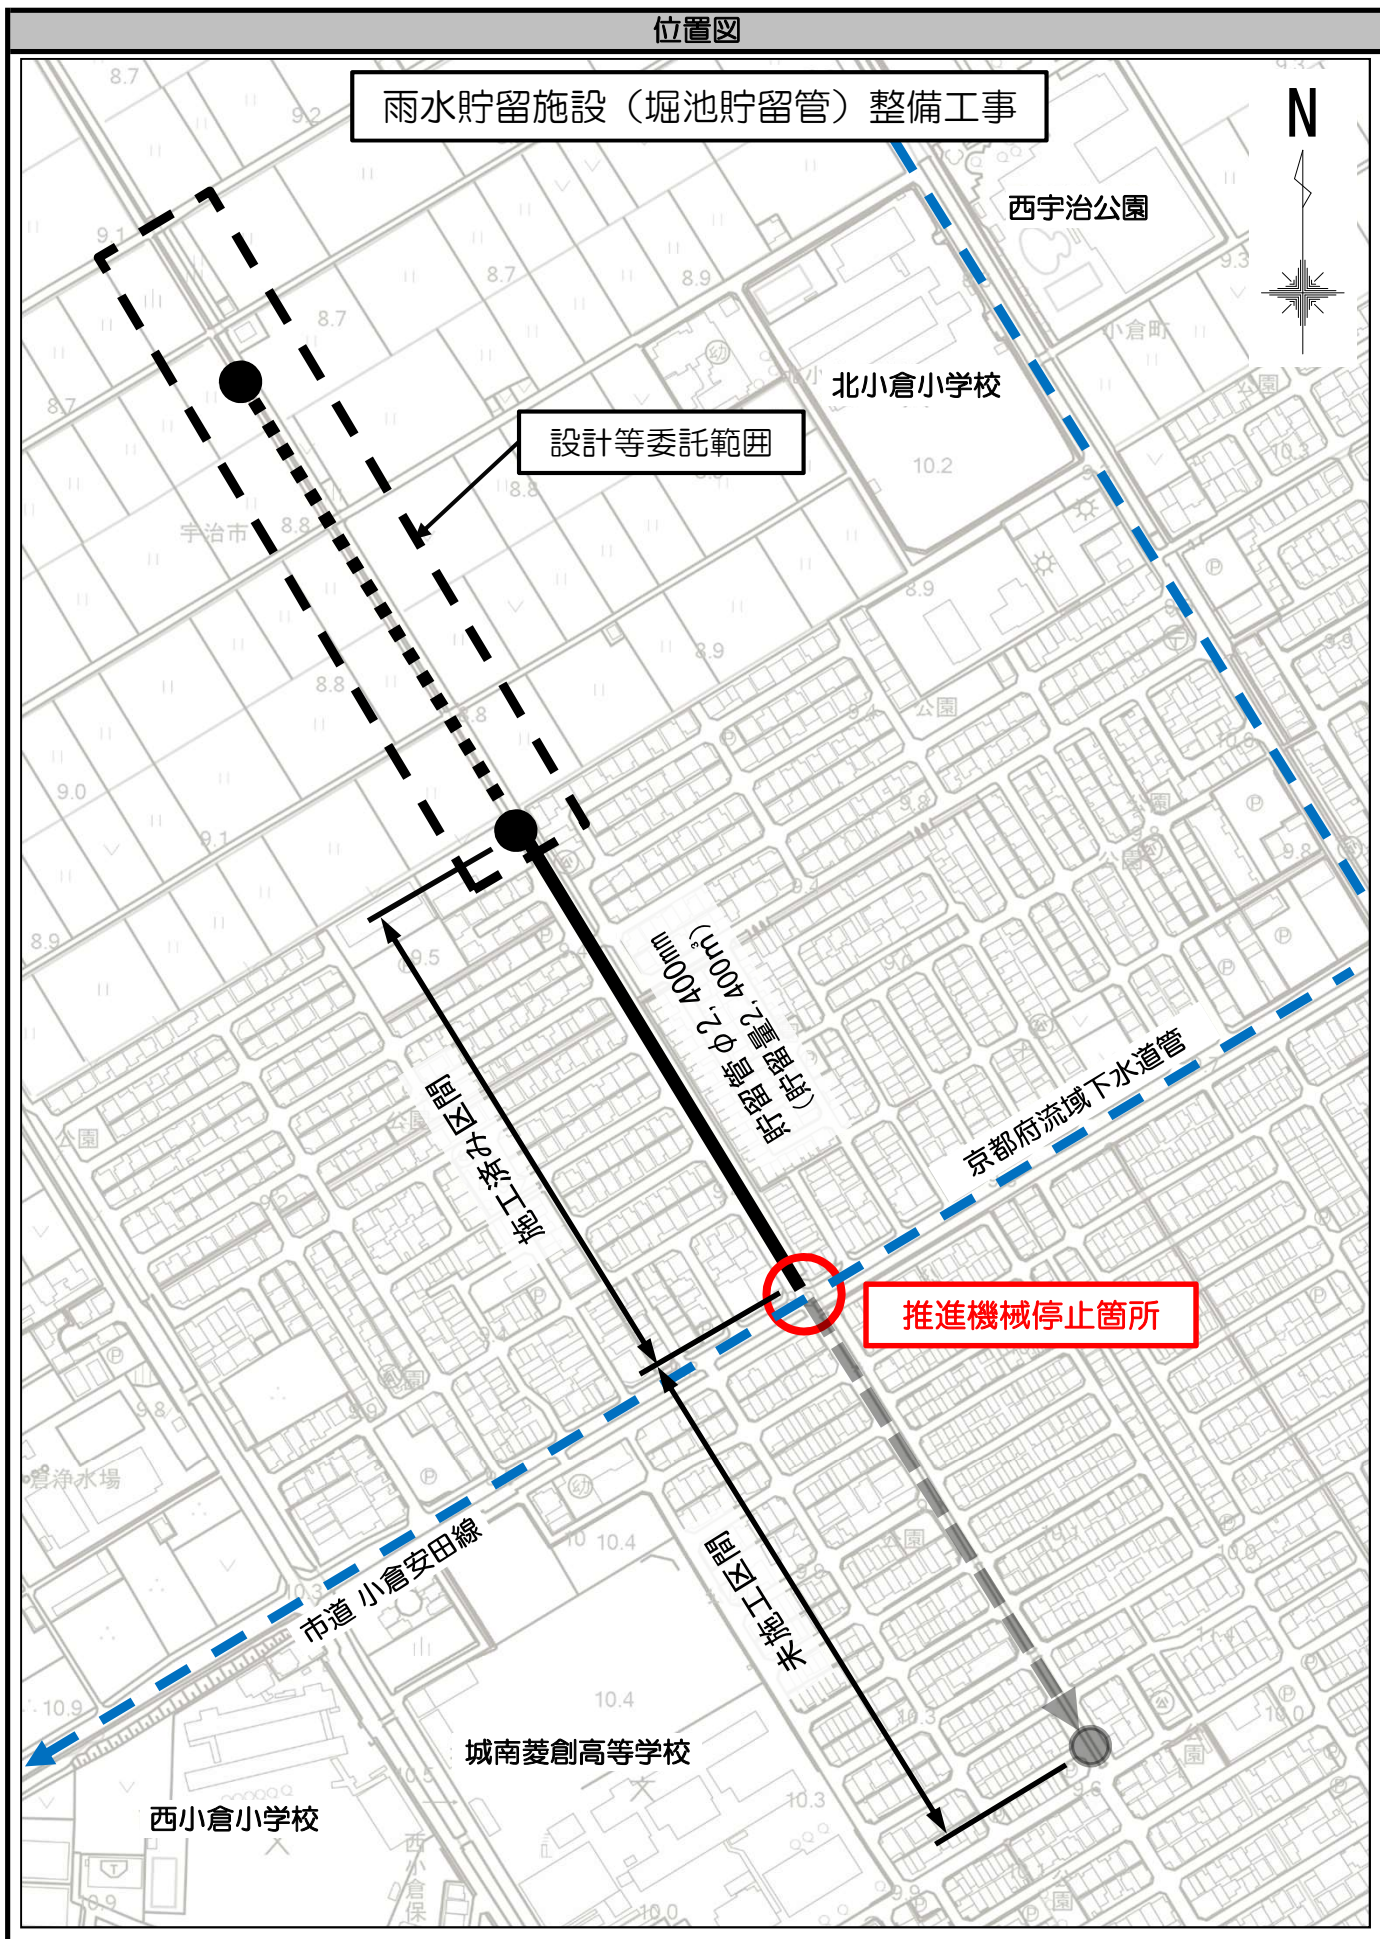

位置図

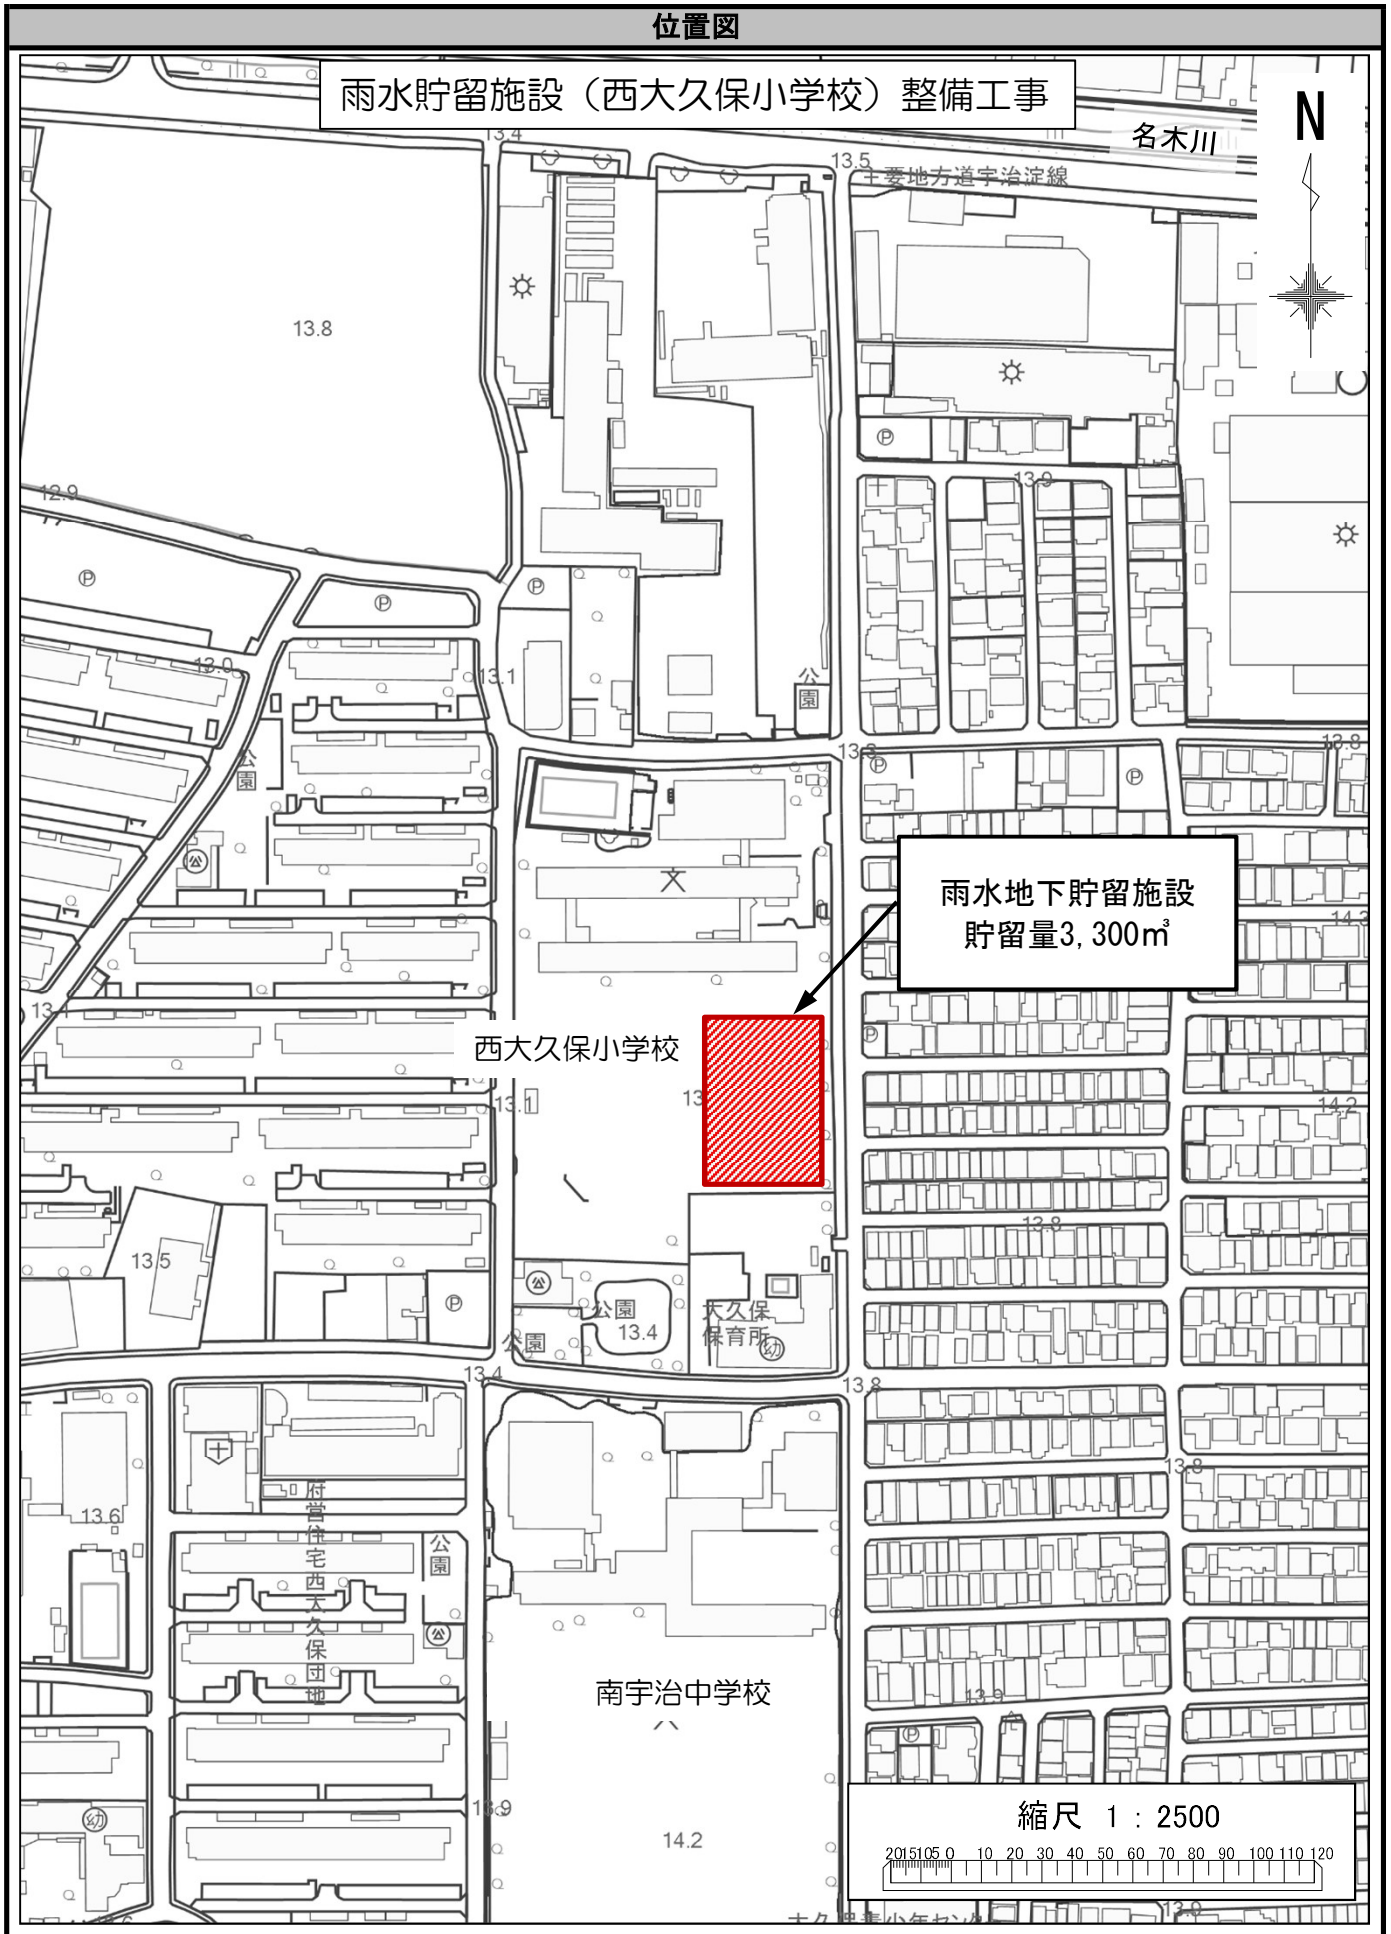

位置図

雨水貯留施設（半白貯留管）整備工事

