


給食センターの進捗状況について

1. 給食センターの工程について

令和8年4月の開業は予定通り（設計や工事の期間等に変更）

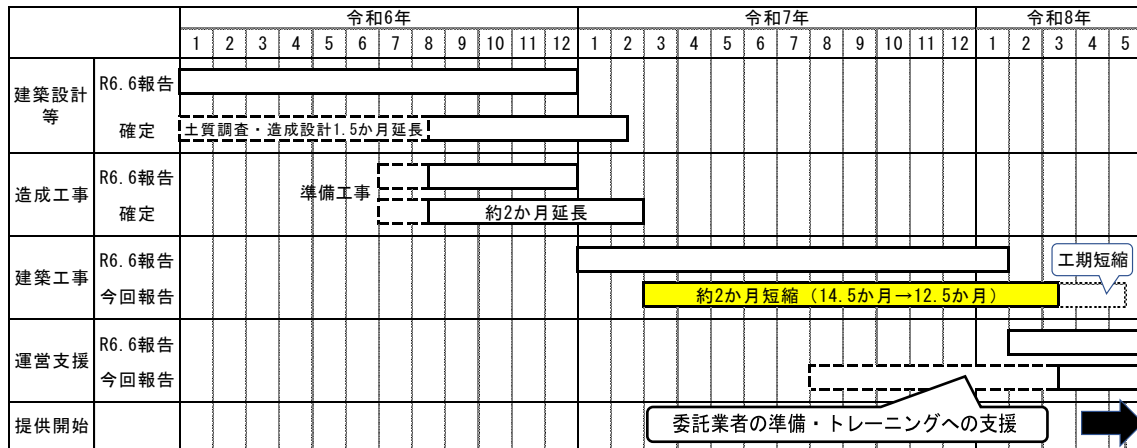

（設計・工事等の期間に検査期間を含む）

＊運営支援：DB事業者が市及び調理委託業者に対して行う設備等の取り扱い説明や調理リハーサルの支援等。開業後5月末まで実施予定。

2. 工事変更の概要について

	時期	概要
建築設計等	6年4月下旬	土質調査結果を分析し、支持層の下に一部粘土層を確認 ⇒対応方法を検討
	6月中旬	追加土質調査実施
	7月下旬	土質調査結果を反映し、擁壁・建物基礎・地盤改良深さ等を変更して造成設計完了、建築基本設計完了
	7年2月中旬	建築実施設計完了
造成工事	6年7月上旬	造成準備工事に着手
	8月下旬	宅造許可を受けた後、造成工事に着手 地盤改良の追加、センターの地盤の高さを下げたことによる搬出土量の増加及び擁壁高の変更等
	7年2月中旬	造成工事完了
建築工事	7年3月上旬	建築工事を開始（当初予定より2月遅れ） 建物基礎工事量増加、市調整による面積増・追加工事、工法調整や揚重機大型化・人員の増員等で工期調整
	8年3月上旬	建築工事完了予定

3. 事業費見込みについて

(1) 調査・設計・造成工事費

追加の土質調査、造成設計・建築設計の変更・修正、追加の擁壁・建設土の搬出・地盤改良等

・・・令和7年度当初予算に債務負担行為を計上済

(2) 建築工事費

建物構造の変更、設備や外構計画の改良、建設工期短縮のための工法変更及び作業員増員

・・・今後追加分について補正予算として提案を予定

建設工期の短縮により令和8年4月からの給食提供開始予定

4. 給食センター調理等業務委託について

(1) プロポーザル実施状況

- ・参加者数 5社
- ・審査内容 書類審査、各社からのプレゼンテーション、ヒアリング
- ・決定業者 ㈱東洋食品 (採点結果：401点／410点満点)
- ・契約日 令和7年7月29日

(2) 業者決定の主なポイントについて

- ・同規模以上のセンター等の豊富な業務実績。
- ・配置予定責任者等の業務経験や緊急時の充実した支援体制。
- ・食育や食物アレルギー対応等への取り組み提案。

(3) 契約額 951,984,000円

(4年間・予定価格1,120,000,000円)

(4) その他

- ・開始前のトレーニングについて、配置予定の従業員を近隣他市で業務を受託している給食センターに配置し、実際の調理業務の中で育成することを提案。
- ・配送業務経験を踏まえた委託業者の配送案について、今後各中学校の配膳室等の現地確認や配送車の実走を踏まえ、調整を図り配送計画を確定する。

5. 給食運営等の開始に向けた取り組み

- ・中学校給食検討会議、校長会との協議
 - 児童・生徒への食物アレルギー調査について夏休み前から開始
 - 各校における配膳台等備品の確認
- ・各校給食準備担当教員への研修等の実施
 - 食物アレルギー対応等マニュアルの配付、配膳室での配膳作業確認
- ・家庭への「給食センターだより」の配付(6月・7月)
 - 中学校給食のお知らせ、工事の進捗状況等
