

工 事 週 報 実 施 工 程 表 施 工 報 告		令和 7 年 6 月 4 日 ~ 令和 7 年 6 月 24 日																		作成： 令和7年6月11日		監督者		現場代理人 監理技術者		主任技術者					
		(仮称)西小倉地域小中一貫校整備事業に伴う機械工事 【アリーナ棟】																		【受注者名】 扶桑管・ウチラ 特定建設工事共同企業体											
施工場所	区 分	工事週報（実施報告）								実施工程表（今週）								実施工程表（来週）								施工報告書					
	年／月	令和7年6月																								※報告は一工程終了毎とする。 （確認内容も含めて記載する）				資料 の有無	
	日 曜 日	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火									
行事予定		機械設備 見学会 全体定例 分科会																													
アリーナ棟（1工区） 躯体工事工程		型枠建込／配筋 M3階CON 墨出し 型枠建込／配筋																													
アリーナ棟（2工区） 躯体工事工程		柱・外壁型枠 壁リブ 取付 RGリブ 墨出し																													
アリーナ棟（3工区） 躯体工事工程		型枠／配筋 M3階CON 鉄骨段取り																													
アリーナ棟（4工区） 躯体工事工程		型枠／配筋 3階CON M3階CON 墨出し リブ取付 型枠／配筋																													
アリーナ棟（5工区） 躯体工事工程		5-1 5-2 柱・外壁型枠／配筋 5-3 型枠／配筋 3Gリブ 取付 2階CON 墨出し CON立会い 型枠／配筋																													
アリーナ棟（1・3・4工区） 内部工事工程		1階工程 1/1リブ CON 墨出し 額縁取付 先行区両壁LGS・ボード貼り LSD・SD 取付 壁LGS・ボード貼り LGS貫通位置 墨出し 機器位置墨出し 機器吊込（EHP室内機・吹付け・ファン） 冷媒・ドレ配管（先行範囲） 衛生天井配管・ダクト吊込み（先行範囲） 間仕切り壁先行施工（消火ポンプ室～倉庫3） ファン・ダクト吊込み（倉庫3） 天井配管（倉庫3） ダクト保温 6/23～倉庫3 作業員詰所として使用																													
アリーナ棟（2工区） 内部工事工程		1階工程 1/1リブ CON 墨出し 額縁取付 先行区両壁LGS・ボード貼り LSD・SD 取付 壁LGS・ボード貼り LGS貫通位置 墨出し 機器位置墨出し 機器吊込（ファン） ダクト吊込（先行範囲）																													
アリーナ棟（5工区） 内部工事工程																															
その他		機器搬入（GHP、EHP、吹付け、ファン） ダクト搬入																													
騒音・振動																															
【大・中・小】（左）AM（右）PM																															
打 合 せ 、 検 査		◎																													
天 気		○ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ● ◎ ● ●																													

槽内施工済み
（近日消防検査予定）

【アリーナ棟ビット内配管】

先行施工範囲

5工区

2工区

1・3・4工区

6/16～
機器吊込
天井配管
（先行分）

【アリーナ棟1階】



【記 事】※検査項目等記載

上記の内容について確認しましたので報告します。

扶桑管・ウチラ 特定建設工事共同企業体

監理技術者 佐 田 勝



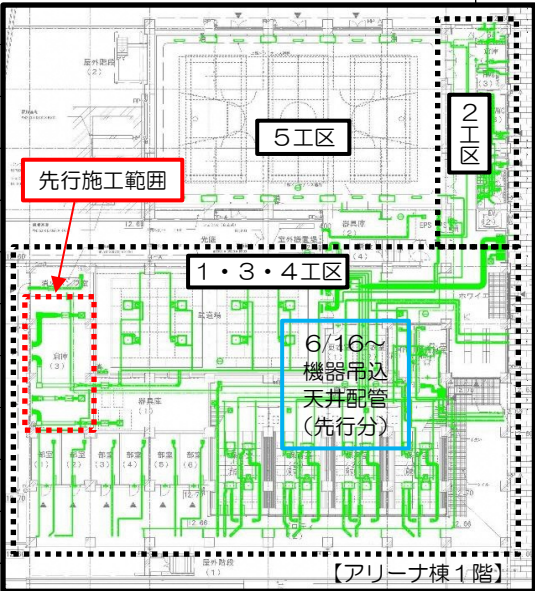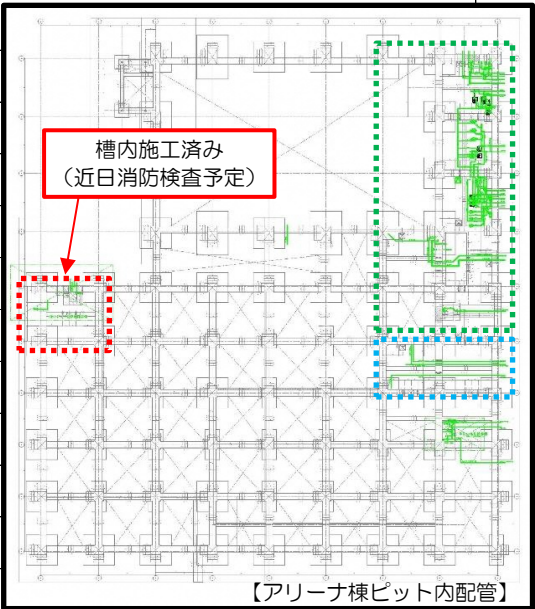

【記 事】※検査項目等記載

上記の内容について確認しましたので報告します。

扶桑管・ウチラ 特定建設工事共同企業体

監理技術者 佐田 勝
