

工 事 週 報 実 施 工 程 表 施 工 報 告		令和 7 年 12 月 17 日 ~ 令和 8 年 1 月 13 日													作成： 令和7年12月24日			監理者 現場代理人 監理技術者 主任技術者																						
		(仮称)西小倉地域小中一貫校整備事業に伴う機械工事													【受注者名】 扶桑管・ウチラ 特定建設工事共同企業体																									
施工場所	区 分	工事週報 (実施報告)							実施工程表 (今週)							実施工程表 (来週)							施工報告書																	
	年/月	令和7年12月														令和8年1月							※報告は一工程終了毎とする。 (確認内容も含めて記載する)		資料 の有無															
	日	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																	
曜 日		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火																	
行事予定										全体定例 分科会		点検 清掃	年末年始休暇	点検				全体定例 分科会						※全体定例は1/22が最終回予定																
校舎棟 屋上工事工程		室外機まわり冷媒配管、計装配管・配線					冷媒管フック、配管塗装 (下塗)、計装配線など					ガス開栓 (空調系統)					GHP試運転・調整・測定																							
		室外機まわり都市ガス配管					給湯器まわりガス配管																																	
							屋根裏配管					給湯器まわり衛生配管																												
												補給水槽まわり配管復旧																												
												屋根裏・給湯器・補給水槽まわり配管保温 (下付)																												
校舎棟 (1~5工区) 内部工事工程		各階 天井・制気口、壁開口取付										給水止水栓取付					加圧ポンプ二次側 通水作業 (各階SKのみ水量調整とも)					水量調整 洗管作業																		
												ガス給湯器取付、ガス接続					キッチン 止水栓取付																							
												各所 洗面器取付、キッチン・備品家具まわり止水栓取付					キッチンまわり電気温水器																							
校舎棟 (各階) WC工事工程		衛生器具取付 (3階)										各階WC洗面器・流し 止水栓・器具取付					各階WCトイレ・類取付、洗面器取付																							
アリーナ棟 屋上工事工程		室外機まわり冷媒配管、計装配管・配線					冷媒管フック、配管塗装 (下塗)、計装配線など					ガス開栓 (空調系統)					GHP試運転 調整・測定					※1/15完了予定 (自家発試運転は最終日実施予定)																		
		室外機まわり都市ガス配管					ガス配管																																	
アリーナ棟 (1~4工区) 内部工事工程		1階工程							直圧通水 (消火水槽水張り)										消火設備試運転は1/14 (予定)					水量調整 洗管作業																
												衛生器具取付 (WC)					加圧ポンプ二次側 通水作業 (各階SKのみ水量調整とも)																							
												各所 キッチン・備品家具まわり止水栓取付					キッチン 止水栓取付																							
アリーナ棟 (1・2工区) 内部工事工程		2階工程		濾過機械室 下部配管 架台設置、配管支持					直圧通水 (プール系統)										濾過機試運転					通水は1/8~ (予定)																
																	衛生器具取付 (WC)					濾過機試運転は1/13~ (予定)																		
		3階工程												衛生器具取付 (WC)										通水は1/8~ (予定)																
アリーナ棟 (小アリーナ工区) 内部工事工程																																								
アリーナ棟 (大アリーナ工区) 内部工事工程																																								
プール (プールビットとも)												プールサイド 各種器具取付										濾過機試運転																		
屋外工事		農具庫・スタッガード							農具庫前 横断配管																															
		受水槽まわり		直圧通水 受水槽系統										受水槽清掃										1/15 取水予定																
		一般外構工事		大アリーナ北西 消火外構					(外構残工事) 各所 ポンプアップ 管接続・散水系統配管										外構各所 樹蓋散水栓BOX設置																					
												ガス開栓 (空調系統)					衛生系統開栓は1/16 (予定)																							
												アリーナ棟 光庭 EHP室外機据付・配管					冷媒管フック					EHP試運転 調整・測定																		
搬入、その他		衛生器具					衛生器具																																	
												各所 風量測定 (校舎棟・アリーナ棟)																												
騒音・振動																																								
【大・中・小】 (左) AM (右) PM																																								
打 合 せ 、 検 査																									◎		◎													
天 気		◎	○	○	◎	○	◎	○	◎	●	◎	●	◎	○	◎																									
(凡例)		総合定例【◎】、分科会【○】、検査【△】																																						

12/22  
ガスメーター  
取付・配管

12/22~24  
散水配管

12/25~27  
光庭 室外機据付  
冷媒配管

12/22~23  
散水配管

校舎棟

アリーナ棟

給水配管

散水配管

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/22

12/22~24

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23

12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

12/22~23


12/20

12/26

12/22

12/22~24

12/25~27

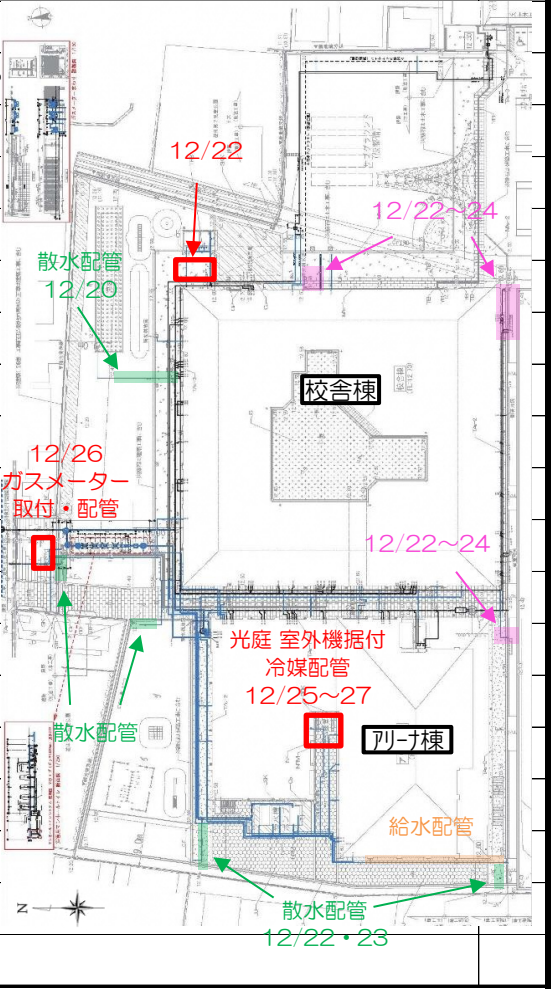

【記 事】※検査項目等記載

上記の内容について確認しましたので報告します。

扶桑管・ウチラ 特定建設工事共同企業体

監理技術者 佐 田 勝 
