

(仮称)西小倉地域小中一貫校整備事業について

1. 工事の進捗状況等について

(工事以前の敷地全体の状況)




令和 6 年 2 月～4 月(仮橋設置、仮設事務所設置、防球ネット・樹木・北門撤去、体育倉庫・柔剣道場解体、仮囲い設置 など実施)

(完成した仮橋)



(5月現在の敷地全体の状況)

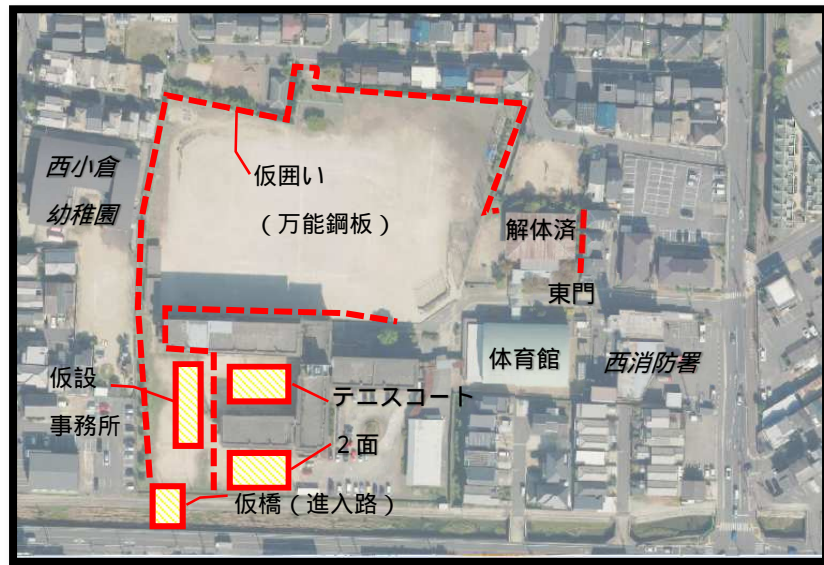

(北校舎3階の廊下側から見たグラウンドの様子・4月上旬)



【作業内容】 杭打ち機で深さ 10m 程度まで穴を開ける
水とセメントを混ぜたセメント系固化材を、敷地内のプラント
で製造しポンプで掘削位置まで送る
土壌とセメント系固化材を攪拌して地盤を改良する
翌日等に、重機で 2m 程度を掘削し削り取る
校舎・体育館等の建設場所に、12～15 箇所程度 / 1 日 実施



2. 西小倉地域小中一貫校開校準備委員会について

西小倉地域の小中学校の保護者、学校運営協議会委員、学校長で構成する学校主体の準備委員会が設置され、今後、(仮称)西小倉地域小中一貫校の開校の準備に必要な事項の意見交換を行います。

- ・ 委員会の構成 : 30 名以内
 校長(4 名)、保護者(各校 3 名以内)
 学校運営協議会委員
- ・ 意見交換予定内容: 校章、校歌、校旗、制服
 体操服、上靴、体育館シューズ、通学カバン、
 帽子
 通学路、登校安全
 行事(運動会、体育大会など)、その他
- ・ 保護者委員の公募: 令和 6 年 4 月 11 日(木)~25 日(木)

3. (仮称)西小倉地域小中一貫校整備スケジュール(予定)

【令和 6 年 5 月時点】(別紙参照)

(仮称)西小倉地域小中一貫校整備スケジュール(予定)【令和6年5月時点】

[illegible]
