


工事週報 実施工程表 施工報告	令和 6 年 6 月 12 日 ~ 令和 6 年 7 月 2 日																			作成： 令和6年7月19日		現場代理人 監理技術者	主任技術者	
	(仮称)西小倉地域小中一貫校整備事業に伴う機械工事																			【受注者名】 扶桑管・ウチラ 特定建設工事共同企業体				
	区分	工事週報 (実施報告)									実施工程表 (今週)					実施工程表 (来週)					令和6年7月		施工報告書	
年/月	令和6年6月																			令和6年7月		※報告は一工程終了毎とする。 (確認内容も含めて記載する)		資料 の有無
日	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2			
施工場所	曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火		
行事予定			全体定例 分科会							全体定例 分科会							全体定例 分科会							
先行給水配管工事		関連他業種工程確認 施工時期未決 施工条件協議 (配管位置など)							関連他業種工程確認 施工時期未決 施工条件協議 (配管位置など)															
その他									各種 納まり検討、各種プロット図作成・協議、施工計画など															
騒音・振動	【大・中・小】 (左) AM (右) PM																							
打合せ、検査			◎○							◎○														
天気	天	気	○ ● ◎ ○ ○	◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○	◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○	◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○	◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○	◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○	◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○	◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○	◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○	◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○	◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○	◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○	◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○	◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○	◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○	◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○	◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○	◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○	◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○	◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○		

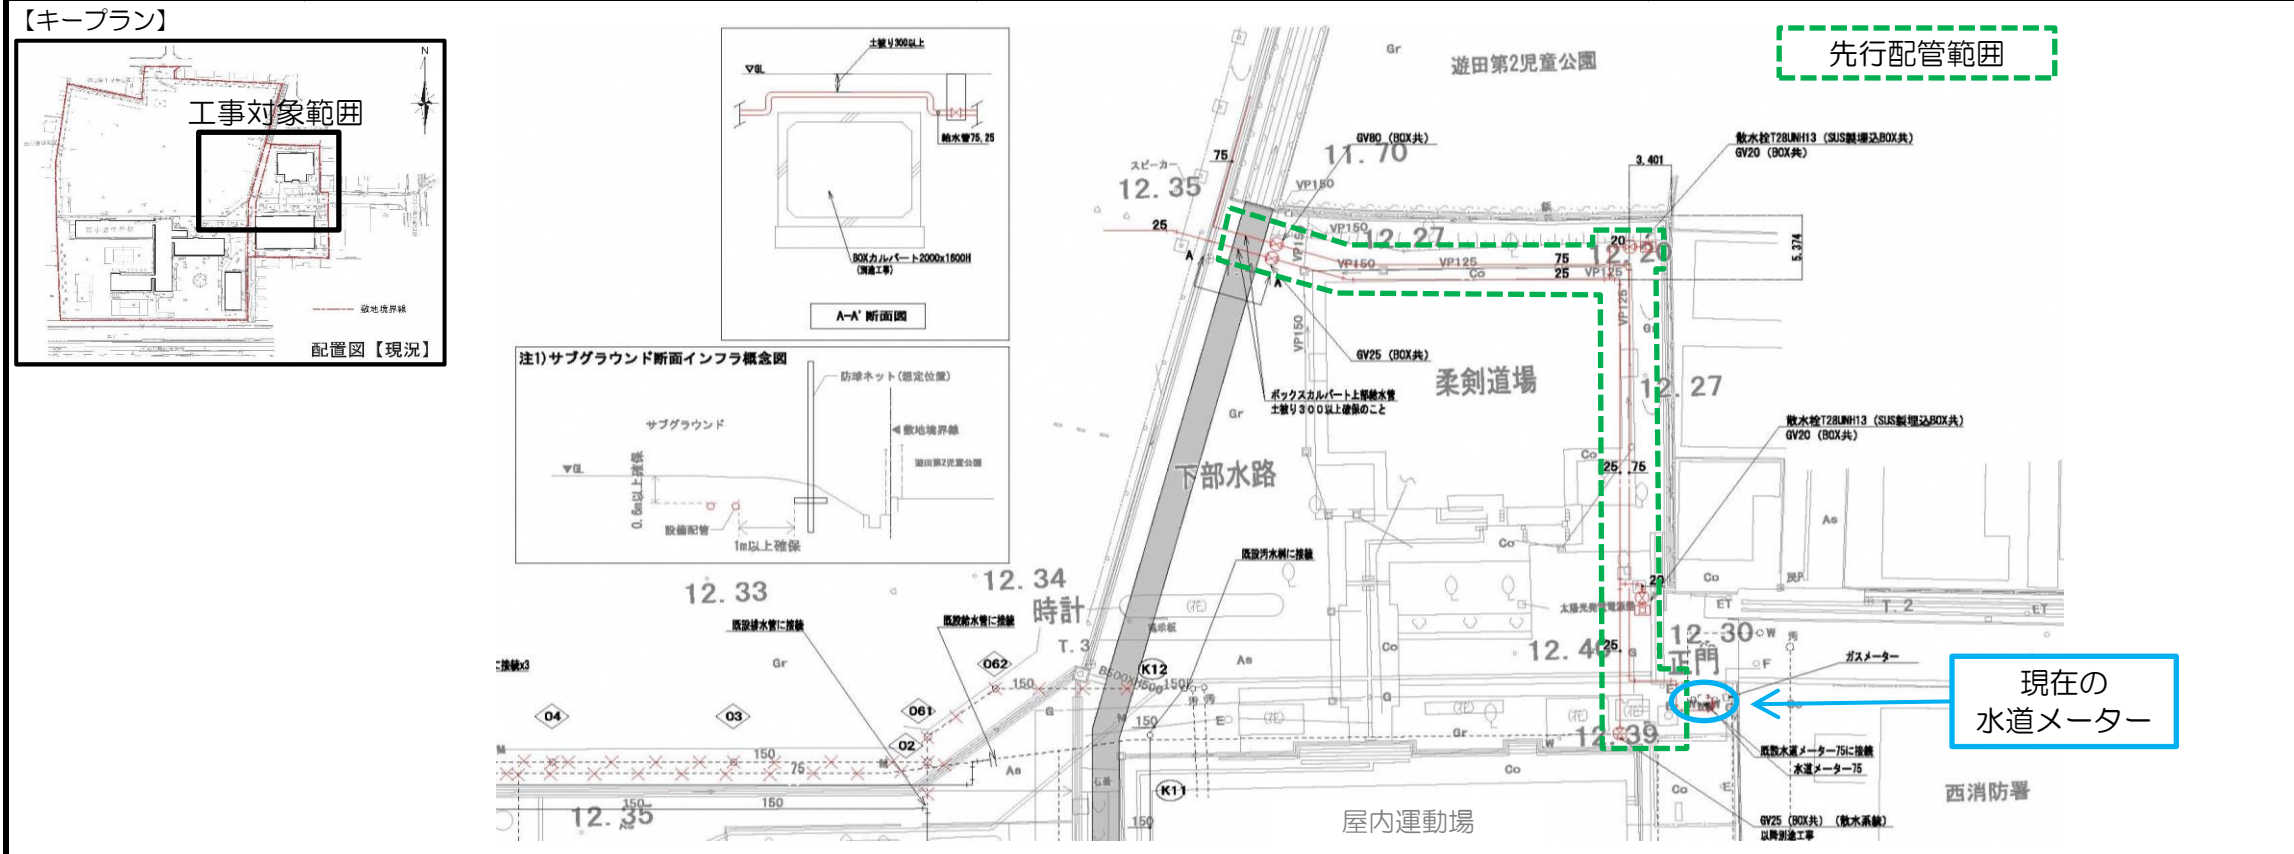

【記事】※検査項目等記載

上記の内容について確認しましたので報告します。

扶桑管・ウチラ 特定建設工事共同企業体

監理技術者 佐田 勝
