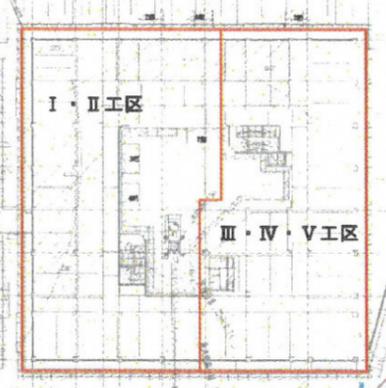
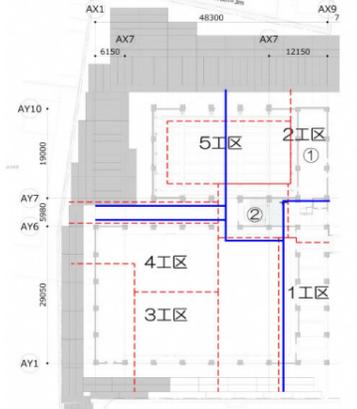


施 工 場 所	区 分	工事週報(先週)							実施工程表(今週)							実施工程表(来週)							施工報告	
	月/日	6.18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	7.1	2	3	4	5	6	7	8	※報告は一工程終了毎とする (確認内容も含めて記載する)。	
	曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火		
校舎棟	R階	←CON合番→																						
	4階 I・II工区 III~V工区																						← 配線 →	
	3階 I・II工区 III~V工区																						← 配線 →	
	2階 I・II工区 III~V工区																						← LGS建込配管・配線 →	
	1階 I・II工区 III~V工区																						← 天井内仕込み →	
アリーナ棟	R階	←CON合番→																						
	3階																						7/22~配線予定	
	2階 I・II工区 大アリーナ																						← 配線段取り(倉庫) →	
	1階 I・II工区 小アリーナ																						← LGS建込配管・配線 →	
外構																								
会議・検査																							◎◎	総合定例【◎】、分科会【○】、検査【△】
騒音		小	小	小	小	小	小	小	小	小	小	小	小	小	小	小	小	小	小	小	小	小	騒音 (一例) 小:充電ドライバー音等程度 中:音は気になるが会話可能程度 大:コンクリートはつり音等程度	
振動		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		

【備考】	 <p>【校舎棟内装工区割】</p>  <p>【アリーナ棟】躯体工区割</p>	【記事】※検査項目等 上記の内容について確認したので報告します。 八千代・村井特定建設工事共同企業体 監理技術者 有家 正喜 
-------------	--	--
