
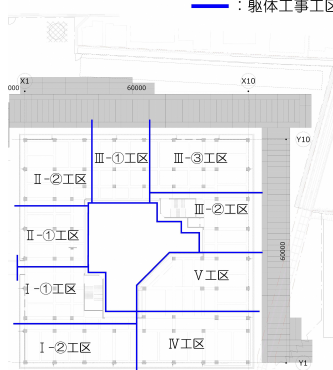
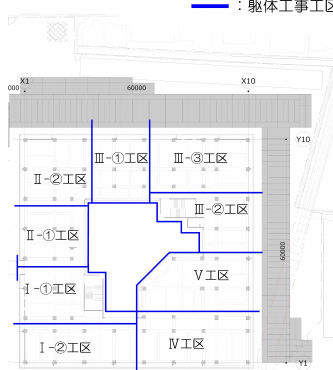
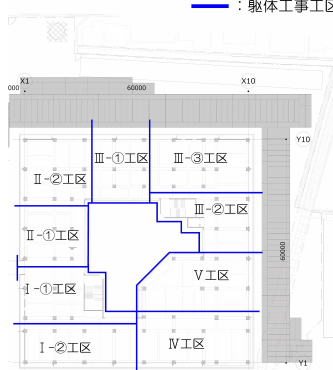


工 事 週 報 実 施 工 程 表 施 工 報 告		令和7年6月18日～令和7年7月8日																												作成日：令和7年6月25日		設計監理	現場代理人	監理技術者	主任技術者																																																																																													
		(仮称)西小倉地域小中一貫校整備事業に伴う建築工事																												【受注者名】 東洋・田中健特定建設工事共同企業体		田野	佐伯	大畑	西村																																																																																													
区 分		工 事 週 報(先週)														実施工程表(今週)														実施工程表(来週)														施 工 報 告																																																																																				
施工場所		月		6月																												7月																												※報告は一工程終了毎とする。 (確認内容も含めて記載する。)																																																																				
		日																																																																																																																														
		曜 日																																																																																																																														
準備工・仮設工事				北園計・足場組 外周足場組 アスベスト																																																								＜今後の予定＞																																																																				
校舎棟 躯体工事		I 工区		型枠解体 基礎基礎CON 型枠解体																												型枠解体 躯体調整、鉄骨段取																																										：躯体工事区割																																																						
		II 工区		型枠建込/配筋 型枠解体																												型枠解体 躯体調整、鉄骨段取																																																																																																
		III-1工区		型枠解体																												躯体調整、鉄骨段取																																																																																																
		IV 工区		型枠建込/基礎配筋 型枠解体																												型枠解体 躯体調整、鉄骨段取																																																																																																
		III-2・3工区		型枠建込/基礎配筋 型枠解体																												型枠解体 躯体調整、鉄骨段取																																																																																																
校舎棟 外装工事		V 工区		型枠建込/配筋 型枠解体																												型枠解体 躯体調整、鉄骨段取																																										：躯体工事区割																																																						
				左官補修・シーリング																												外壁・軒天塗装																																																																																																
		1階		I・II 工区																												天井下地組																																																																																																
		2階		III・IV・V 工区																												ボード貼																																																																																																
		3階		I・II 工区																												躯体調整・墨出																																																																																																
アリーナ棟 躯体工事		2工区		型枠建込/配筋																												型枠建込/配筋																																										：躯体工事区割																																																						
		1工区		型枠建込/配筋																												型枠建込/配筋																																																																																																
		4工区		型枠建込/配筋																												型枠建込/配筋																																																																																																
		3工区		鉄骨段取																												鉄骨段取																																																																																																
		5-①②工区		型枠建込/配筋																												型枠建込/配筋																																																																																																
		5-③工区		型枠建込/配筋																												型枠建込/配筋																																																																																																
		1階		LSO/SD取付																												ウレタン吹付																																																																																																
警備員予定		警備員1名(2名(常駐))																																																																																																																														
ラフタークレーン/生コンポンプ予定		10t P																												25t R/C																												25t R/C																																																																						
東門通行車両		3台																												3台																												3台																												3台																																										
騒音・振動		大																												中																												中																												大																																										
各行事予定		週間工程																												一斉清掃																												週間工程																												一斉清掃																																										
打合せ○ 検査△ 事前調査※																																																																																																																																
天 気		○ 晴																												● 雨																												○ 晴																																																																						
記 事		6/23 校舎棟R階配筋検査①(打設前) 6/25 校舎棟R階配筋検査②(打設前) 6/30 アリーナ棟小アリーナ配筋検査(打設前)																												【備 考】 中学校 幼稚園 6/19 開校説明会(13:30～17:00) 6/26、27 期末テスト(午前中)																												※BHはバックホウを示す ※TCはタークレーンを示す ※CCはクローラークレーンを示す ※PIは生コンポンプ車を示す ※RCはラフタークレーンを示す																																																																						
（検査項目等記載）																																																																																																																																

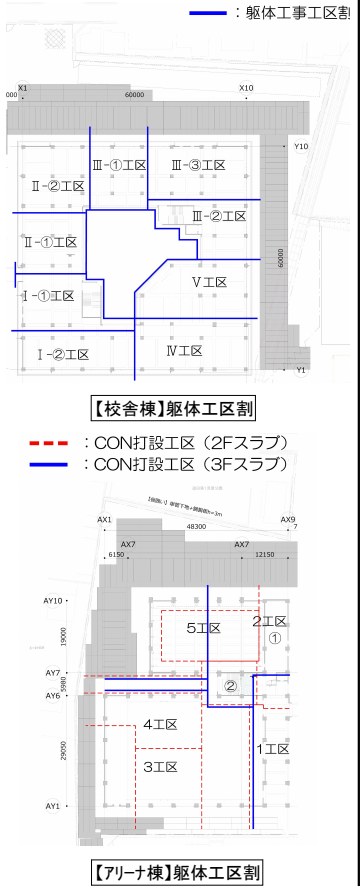

上記の内容について確認したので報告します。

監理技術者
氏 名 大畑 勝弘

大畑
