

工 事 週 報 実 施 工 程 表 施 工 報 告		令和 7 年 9 月 3 日 ~ 令和 7 年 9 月 23 日																				作成： 令和7年9月10日		監督者 現場代理人 監理技術者		主任技術者																	
		【(仮称)西小倉地域小中一貫校整備事業に伴う機械工事 】【校舎棟】										【受注者名】 扶桑管・ウチラ 特定建設工事共同企業体																															
施工場所	区 分	工事週報（実施報告）										実施工程表（今週）										実施工程表（来週）										施工報告書											
	年/月	令和 7 年 9 月																														※報告は一工程終了毎とする。 （確認内容も含めて記載する）		資料 の有無									
	日	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23																					
	曜 日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火																					
行事予定																																											
校舎棟（A・B工区）西・南 躯体工事工程		軒天下地・ボード貼										軒天塗装										足場解体										アスファルト防水											
校舎棟（C・D工区）東・北 躯体工事工程		軒天下地・ボード貼																				軒天塗装																					
校舎棟（1・2工区） 内部工事工程		1階工程										壁塗装																															
2階工程												天井下地・ボード貼り、壁塗装																															
3階工程												天井下地・ボード貼り、壁塗装																															
4階工程		ウレタン吹付										ウレタン吹付										先行区画壁 LGS／ボード																					
校舎棟（3～5工区） 内部工事工程		1階工程										天井ボード貼り、壁塗装										壁塗装																					
2階工程												天井下地・ボード貼り、壁塗装																															
3階工程												天井下地・ボード貼り、壁塗装																															
4階工程		ウレタン吹付										ウレタン吹付										先行区画壁 LGS／ボード																					
搬入、その他												天井裏 4階分										器具入・制気口 2階分										制気口BOX 4階分											
騒音・振動																																											
打 合 せ 、 検 査																																											
天 気		☉ ○ ☉ ● ☉ ● ○ ○ ☉										○ ● ○ ☉																															

5/12～
機器吊込
天井配管

6/25～
機器吊込
天井配管

【校舎棟2階】

7/14～
機器吊込
天井配管
（先行分）

7/22～
機器吊込
天井配管
（先行分）


【校舎棟3階】

【記 事】※検査項目等記載

上記の内容について確認しましたので報告します。

扶桑管・ウチラ 特定建設工事共同企業体

監理技術者 佐 田 勝

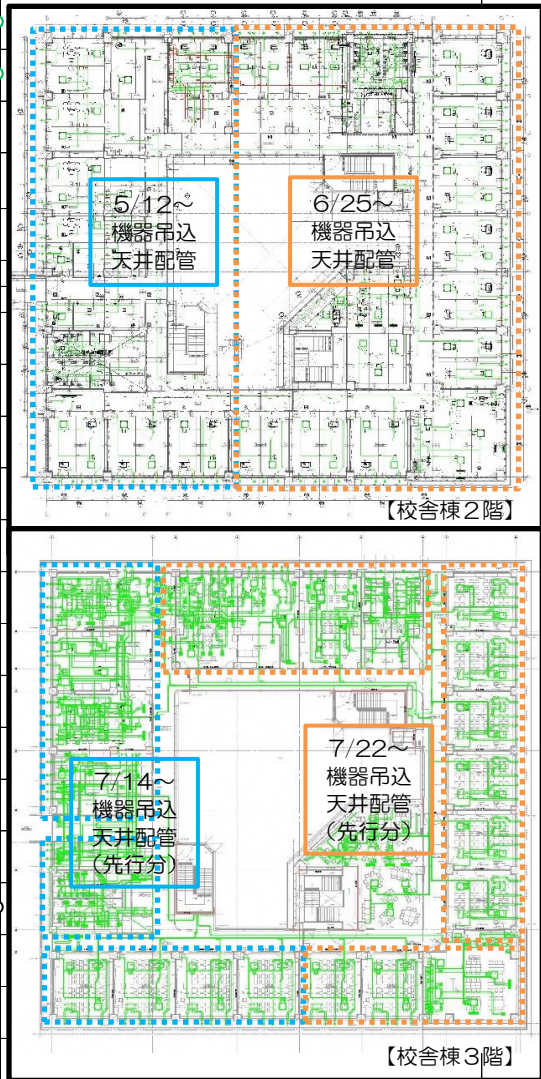

上記の内容について確認しましたので報告します。

扶桑管・ウチラ 特定建設工事共同企業体

監理技術者 佐田 勝

(凡例) 総合定例【◎】、分科会【○】、検査【△】 晴れ【○】、曇り【◎】、雨【●】、雪【*】
