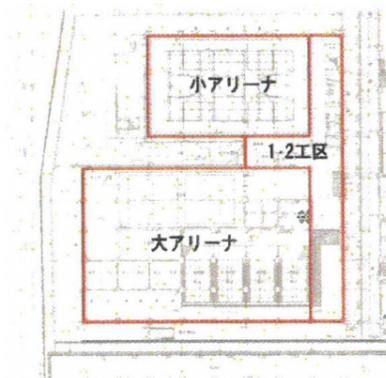
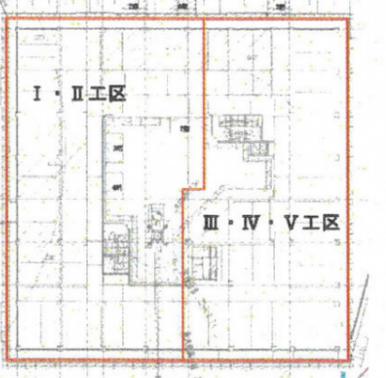


施 工 場 所	区 分	工事週報(先週)							実施工程表(今週)							実施工程表(来週)							施工報告						
		9.3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	※報告は一工程終了毎とする (確認内容も含めて記載する)。						
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火							
校舎棟	R階			← 太陽光パネル(南側) →						← 太陽光露出配管 →						← 太陽光パネル(東側)/仕舞 →													
	4階	I・II工区																											
		III~V工区																											
	3階	I・II工区																											
		III~V工区																											
2階	I・II工区																												
	III~V工区																												
1階	I・II工区																												
	III~V工区																												
アリーナ棟	R階																												
	3階	I・II工区																											
		III~V工区																											
	2階	I・II工区																											
1階	I・II工区																												
外構																													
会議・検査																												総合定例【◎】、分科会【○】、検査【△】	
騒音		小	小	小	小		小	小	小	小	小	小				小	小	小	小	小							騒音(一例) 小:充電ドライバー音等程度 中:音は気になるが会話可能程度 大:コンクリートはつり音等程度		
振動		無	無	無	無		無	無	無	無	無	無				無	無	無	無	無									

【備考】  <p style="text-align: center;">【内部工区割】</p>  <p style="text-align: center;">【校舎棟内装工区割】</p>	【記事】※検査項目等 上記の内容について確認したので報告します。 八千代・村井特定建設工事共同企業体 監理技術者 有家 正喜 
--	--
