



工 事 週 報 実 施 工 程 表 施 工 報 告		令和7年9月3日～令和7年9月23日																		作成日：令和7年9月9日				設計監理	現場代理人	監理技術者	主任技術者
		(仮称)西小倉地域小中一貫校整備事業に伴う建築工事																		【受注者名】 東洋・田中健特定建設工事共同企業体				田野	佐伯	大畑	西村
区 分		工 事 週 報(先週)						実施工程表(今週)						実施工程表(来週)						施 工 報 告							
施工場所	月	9月																						※報告は一工程終了毎とする。 (確認内容も含めて記載する。)			
	日	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
曜 日		(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)					
準備工・仮設工事						中庭ｽﾏｰﾂ解体 取替					屋上足場解体① 取替					足場組立 ｽﾏｰﾂ											
校舎棟 屋上工事	A・B工区					軒天地下・ﾎﾞｰﾄﾞ				軒天塗装	足場解体					ｱｽﾌｧﾙﾄ防水											
	C・D工区					軒天地下・ﾎﾞｰﾄﾞ								軒天塗装													
校舎棟 外装工事						4階 外壁塗装								中庭(東・南) 外壁塗装													
						中庭 外壁塗装								4階 軒天地下・軒天杉板貼													
校舎棟 内装工事	1階	I・II工区									壁塗装																
		III・IV・V工区																									
	2階	I・II工区					天井ﾎﾞｰﾄﾞ・壁塗装								壁防水												
		III・IV・V工区																									
	3階	I・II工区																									
		III・IV・V工区																									
	4階	I・II工区					ウレタン吹				ウレタン吹																
		III・IV・V工区									断縁/LGS/ﾎﾞｰﾄﾞ貼																
	アリーナ棟 屋上・躯体工事	2工区																									
		1工区																									
		大アリーナ																									
		小アリーナ																									
アリーナ棟 内装工事																											
渡り廊下																											
警備員予定																											
ラフタークレーン/生コンポンプ予定 10tﾀﾝﾌﾟ・生コン車台数は上記に記載																											
東門通行車両 原則、通学時間9:00～9:45は通行不可		7台	7台	13台	13台		7台	7台	11台	11台	7台	7台				7台	17台	7台	7台	11台							
騒音・振動 各行事予定		中	中	中	中		中	中	中	中	中	中				中	中	中	中	中							
打合せ○ 検査△ 事前調査※																											
天 気		○	○	●	*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
記 事 (検査項目等記載)		・9/5 監理者中間検査										幼稚園 中学校															

【校舎棟】屋上工区割




【校舎棟】内装工区割

--- : CON打設工区 (2Fスラブ)
--- : CON打設工区 (3Fスラブ)

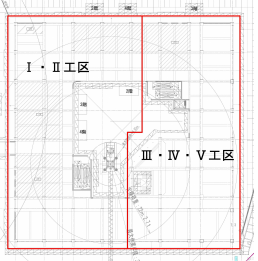

【アリーナ棟】躯体工区割

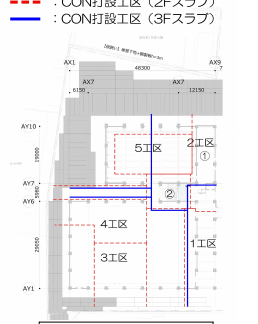

※BHはバックホウを示す
※TCはタークレーンを示す
※CCはクローラー・クレーンを示す
※PIは生コンポンプ車を示す
※RCはラフタークレーンを示す

上記の内容について確認した
ので報告します。

監理技術者
氏 名 大畑 勝弘
