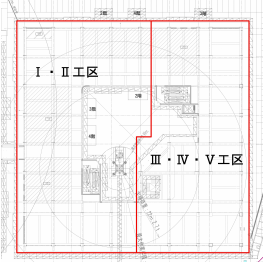
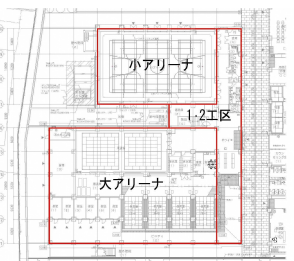


様式-19(公共建築工事標準書式)		令和7年10月15日～令和7年11月4日															作成日:令和7年10月22日		設計監理	現場代理人	監理技術者	主任技術者									
工 事 週 報 実 施 工 程 表 施 工 報 告		(仮称)西小倉地域小中一貫校整備事業に伴う建築工事															【受注者名】 東洋・田中健特定建設工事共同企業体		田 野	佐 伯	大 畑	西 村									
区 分		工 事 週 報(先週)					実施工程表(今週)										実施工程表(来週)					施 工 報 告									
施工場所	月	2025					10月										11月					※報告は一工程終了毎とする。 (確認内容も含めて記載する。)									
	日	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3					4					
	曜 日	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)					(火)					
準備工・仮設工事																								【お知らせ】 【8月1日～12月頃】 防水工事施工の為、 防水材料特有の匂いが発生します。							
校舎棟 屋上工事	A・B工区																														
	C・D工区	CON△																													
校舎棟 外装工事																								 【校舎棟】工区割							
校舎棟 内装工事	1階																														
	2階																														
	3階																														
	4階																														
アリーナ棟 屋上工事	大アリーナ																							 【アリーナ棟】工区割							
	小アリーナ																														
アリーナ棟 内装工事																															
渡り廊下																															
外構工事																															
	農具庫																														
警備員予定																															
ラフタークレーン/生コンポンプ予定 10tダンプ・生コン車台数は上記に記載																															
東門通行車両 騒音・振動 各行事予定																															
打合せ○ 検査△ 事前調査※																															
天 気		○	●	☉	●	*	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
記 事		10/15 校舎棟南・東面 外壁検査 10/20 校舎棟北・西面 外壁検査															【備 考】 中学校 ・10/24 体育祭 ・10/27～31 教育相談 幼稚園 ・10/11 運動会 ・10/17 入園面接										※BHはバックホウを示す ※TCはタークレーンを示す ※CCはクローラークレーンを示す ※PIは生コンポンプ車を示す ※RCはラフタークレーンを示す				
(検査項目等記載)																											上記の内容について確認した ので報告します。 監理技術者 氏 名 大畑 勝弘				
