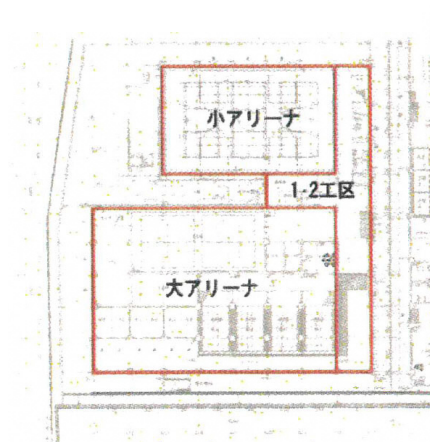
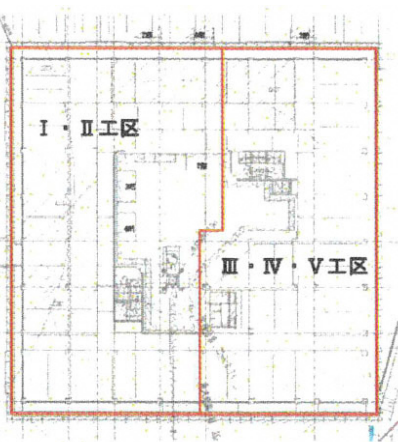


工 事 週 報 実 施 工 程 表 施 工 報 告		令和 7年 12月 10日 ～ 令和 7年 12月 30日																				作成: 令和 7年 12月 17日				設計監理			現場代理人	主任技術者
		(仮称)西小倉地域小中一貫校整備事業に伴う電気工事																							橋本	有家	川村			
施 工 場 所	区 分	工事週報(先週)							実施工程表(今週)							実施工程表(来週)						施工報告								
	月／日	12.10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	※報告は一工程終了毎とする (確認内容も含めて記載する)。							
	曜 日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火								
校 舎 棟	R階	ケーブルラックカバー																					12/27(土)～1/4(日) 年末年始休暇							
	4階								各所器具付け																					
	3階								各所器具付け																					
	2階								各所器具付け																					
	1階 昇降口								器具付け																					
ア リ ー ナ 棟	R階													室外機置場配線																
	3階																													
	2階 ステージ 大アリーナ	配線								盤据付		盤結線		送電		器具付け														
	1階 ピロティ・部室														器具付け															
外 構							東側外構工事		北門付近外構工事																					
会議・検査			◎○														◎○						総合定例【◎】、分科会【○】、検査【△】							
騒音		小	小	小	小		小	中	中	中	中	小		小	小	小	小	小					騒音 (一例)	小:充電ドライバー音等程度 中:音は気になるが会話可能程度 大:コンクリートはつり音等程度						
振動		無	無	無	無		無	無	無	無	無	無		無	無	無	無	無												
【備考】																						【記事】※検査項目等								
<div><div><p>【内部工区割】</p></div><div><p>【校舎棟内装工区割】</p></div></div>																						上記の内容について確認したので報告します。								
八千代・村井特定建設工事共同企業体																														
監理技術者 有家 正喜																														
