

令和3年8月12日からの大雨に伴う準用河川名木川
ならびに主要地方道宇治淀線における復旧状況について

8月13日（金）夕方に発生しました宇治市が管理する準用河川名木川の護岸崩壊ならびに主要地方道宇治淀線の張り出し歩道崩落現場において、京都府山城北土木事務所が実施している仮復旧工事の現在の状況につきまして、下記のとおり報告します。

記

1 被災概要

- 被災延長 約 45m
※ 被災原因は、大雨による増水で名木川の護岸が崩壊したことが原因と考えられる。
- その他の被災として、歩道下を占有していた NTT 通信ケーブルの埋設管が露出

2 交通規制

- 府道宇治淀線の東向き左折車線と北側歩道を通行止め

3 仮復旧工事の概要

- | | |
|-----------------------|---------------|
| ① 崩落した NTT 地中管路保護工事 | : 8月24日完了 |
| ② 増破防止対策のための鋼矢板打設 | : 8月25日開始 施工中 |
| ③ 準用河川名木川河道内の埋そく土砂の撤去 | : 8月27日開始 施工中 |

4 今後の予定

- 仮復旧工事の完了は9月末を予定
- 本復旧については、構造、工法等検討中
- 災害（道路(府)・河川(市)）申請を予定

位置図

陸上自衛隊
大久保駐屯地

京都府管理

宇治市管理

宇治淀線


近鉄
大久保駅

観光案内所
(近鉄大久保駅構内)

被災箇所

縮尺 1 : 2500

20 15 10 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

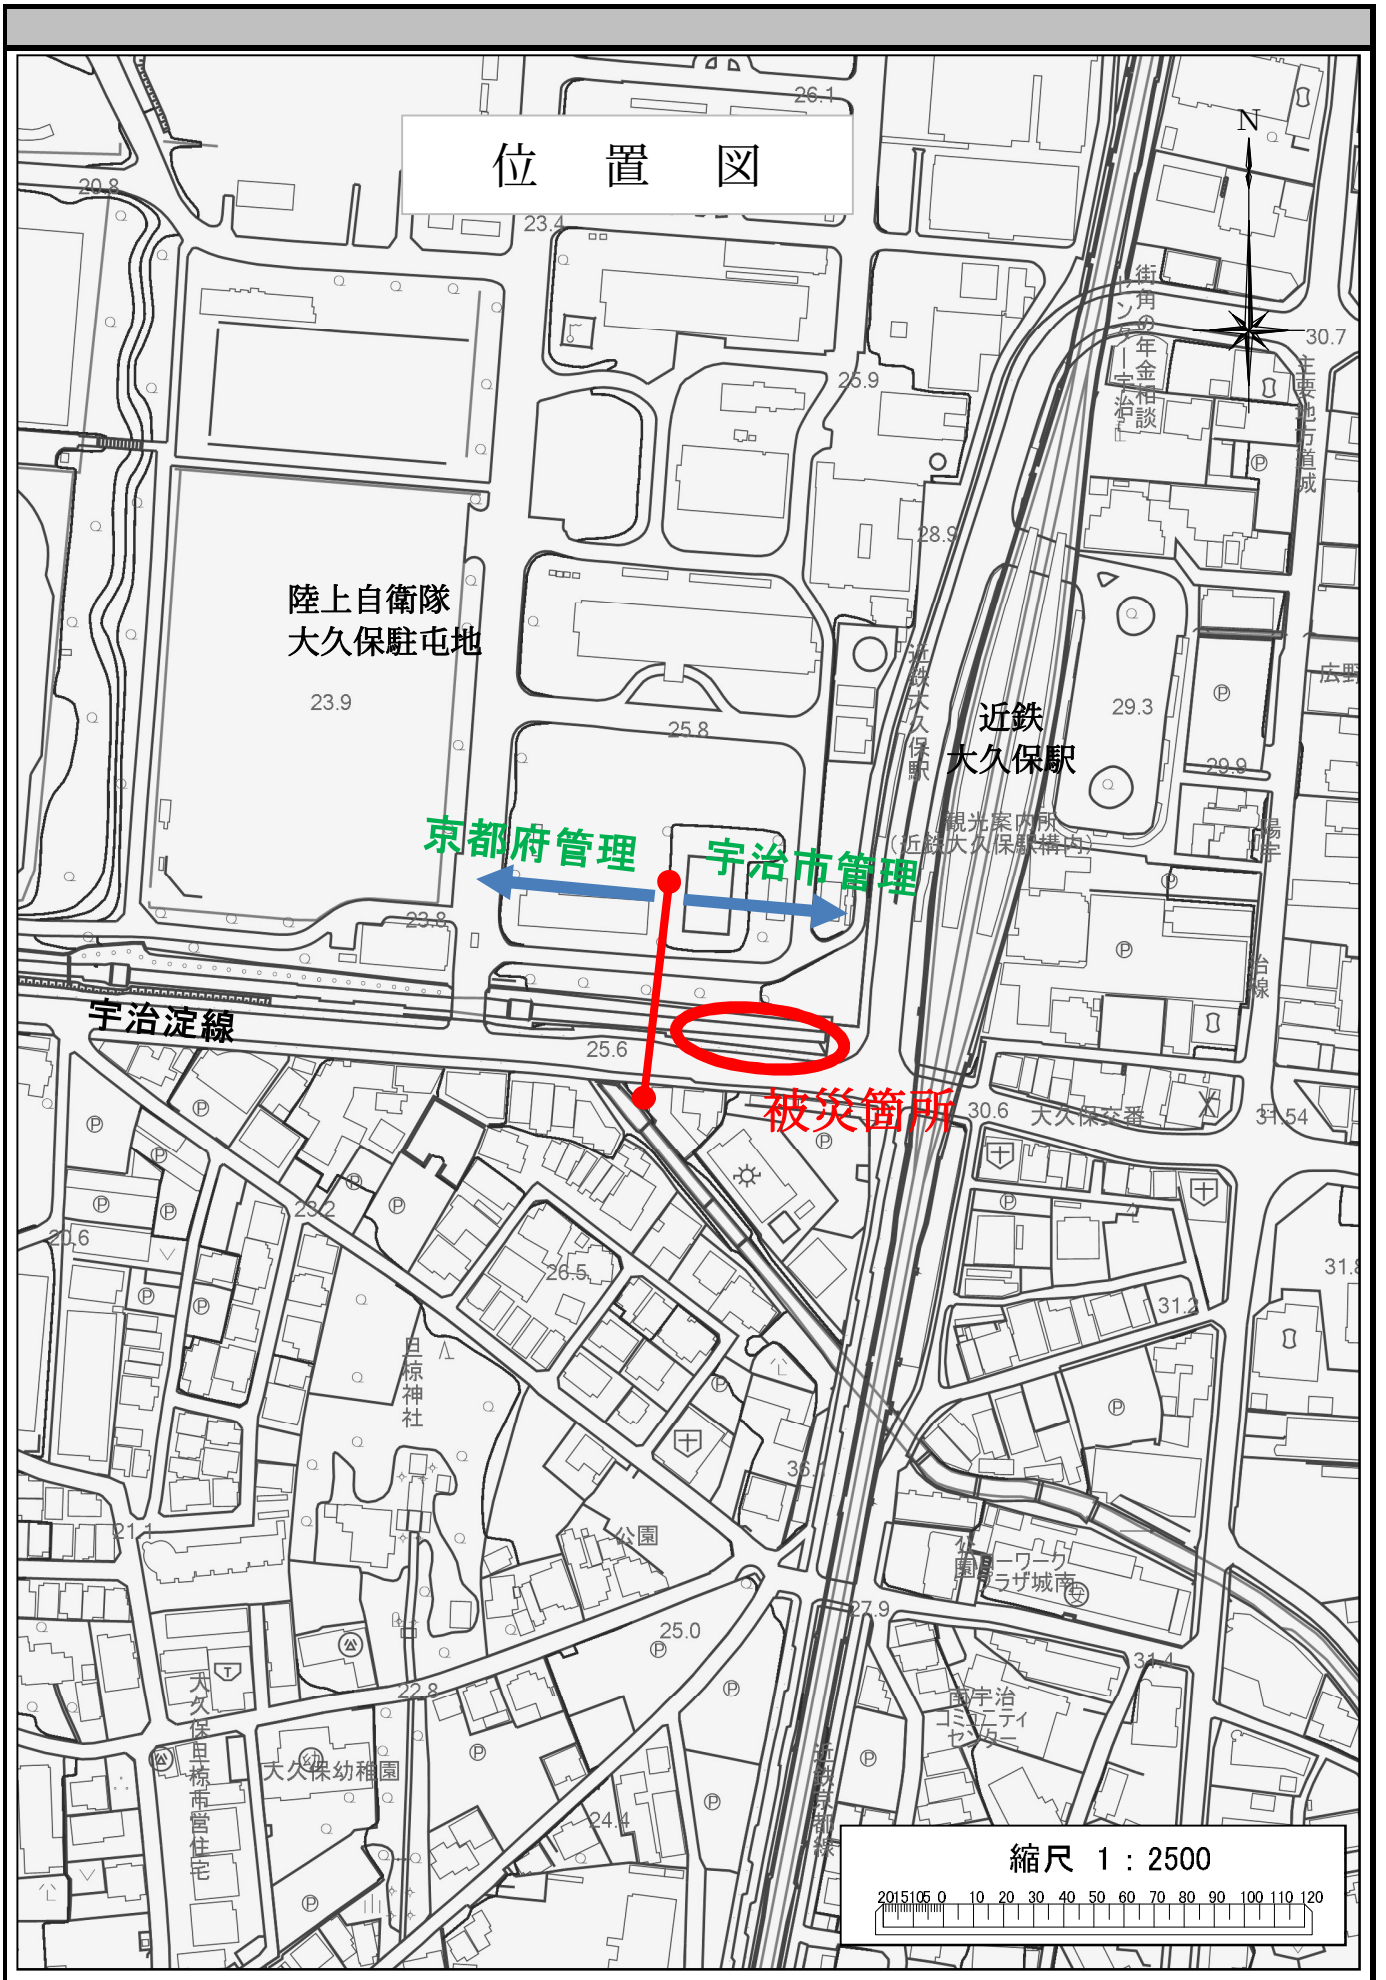


被災箇所状況写真

被災当初撮影



令和 3 年 8 月 31 日撮影

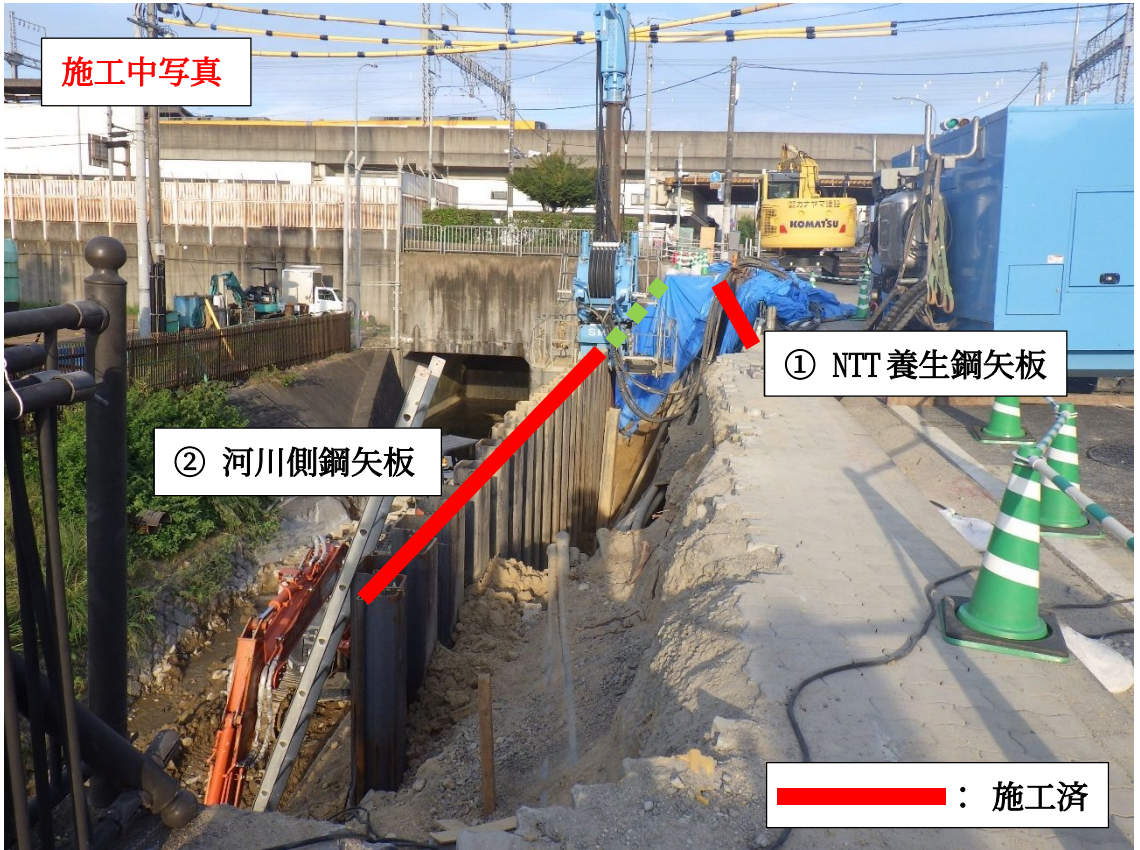

令和3年9月6日撮影

