様式－15

No. 17

| 工事週報<br>実施工程表<br>施工報告 | 令和 6 年 5 月 8 日 ～ 令和 6 年 5 月 28 日 | 作成： 令和6年5月15日 | 現場代理人<br>監理技術者 | 主任技術者 |
|---|---|---|---|---|
| | (仮称)西小倉地域小中一貫校整備事業に伴う機械工事 | 【受注者名】 扶桑管・ウチラ 特定建設工事共同企業体 | | |

| 区分 | 工事週報（実施報告） | | | | | | | 実施工程表（今週） | | | | | | | 実施工程表（来週） | | | | | | | 施工報告書 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年／月 | 令和６年５月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ※報告は一工程終了毎とする。<br>（確認内容も含めて記載する） | 資料の有無 |
| 日 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| 施工場所 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | | |
| 行事予定 | | 全体定例<br>分科会 | | | | | | | 全体定例<br>分科会 | | | | | | | 全体定例<br>分科会 | | | | | | | |
| 先行給水配管工事 | | 関連他業種工程確認<br>施工時期未決<br>施工条件協議<br>（配管位置など） | | | | | | | 施工時期回答<br>（提案済み）<br>施工条件協議<br>（配管位置など） | | | | | | | | | | | | | 8/6・7施工予定（8/1～電気設備先行）<br>施工時期決定次第で工程表作成 | |
| その他 | | | | | | | | | 各種 納まり検討、各種プロット図作成・協議、施工計画など | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 災防協<br>建築 | | | | | | | | |
| 騒音・振動<br>【大・中・小】（左）AM（右）PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 打合せ、検査 | | ◎○ | | | | | | | ◎○ | | | | | | | ◎○ | | | | | | 総合定例【◎】、分科会【○】、検査【△】 | |
| 天気 | ◎ ○ | ○ ◎ | ○ | ○ | ◎ ● | ● ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | 晴れ【○】、曇り【◎】、雨【●】、雪【＊】 | |

【キープラン】

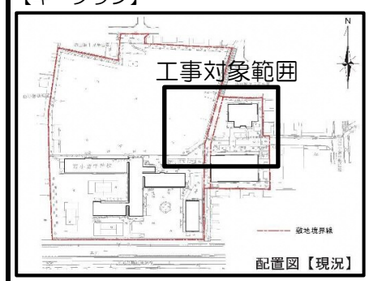


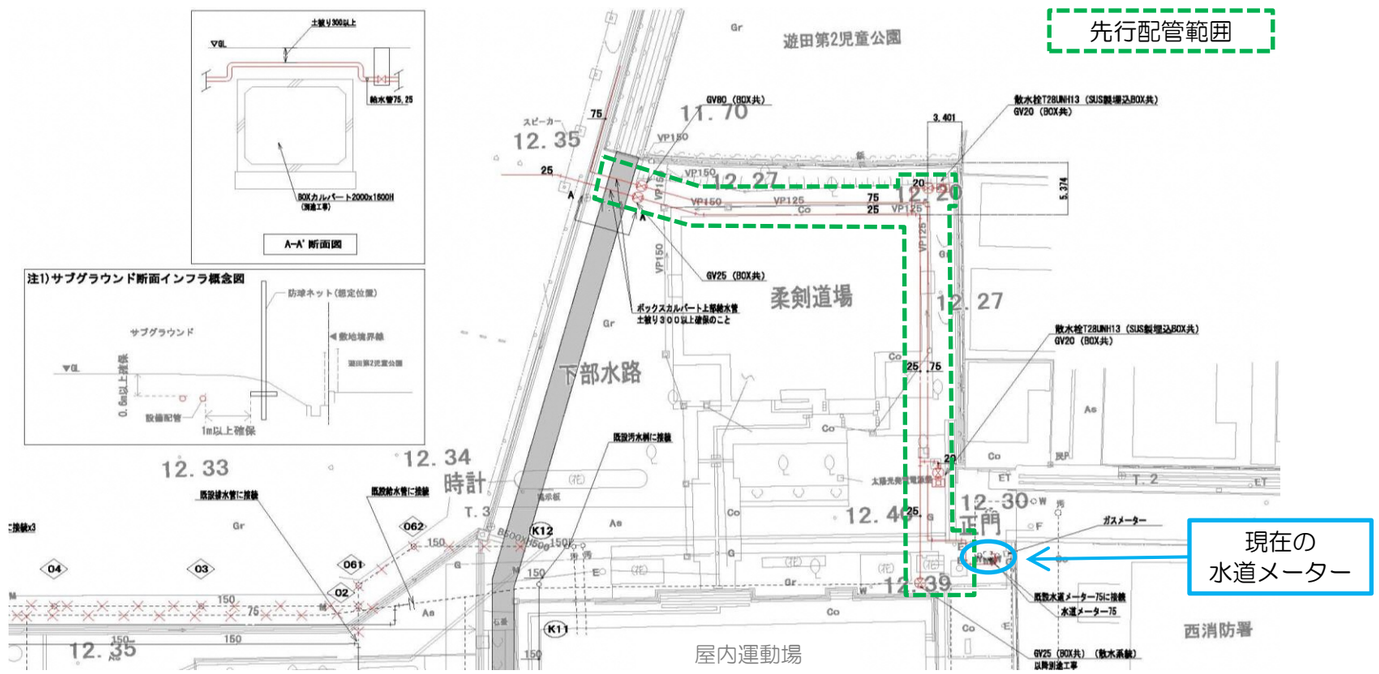


【記 事】※検査項目等記載

上記の内容について確認しましたので報告します。

扶桑管・ウチラ 特定建設工事共同企業体

監理技術者 佐 田 勝
