令和８年１１月２０日
建設・水道常任委員会資料
都市整備部公園緑地課

黄檗公園プールの改修について

黄檗公園プールの改修工事については、本年 4 月に入札公告を取り下げたところですが、今後の改修の予定について報告いたします。

１．これまでの経過

令和６年度	老朽化により子どもプールの大型遊具の使用を中止
令和７年度	老朽化によりプール営業を中止
令和８年４月３日	プール改修工事の入札公告を開始
令和８年４月２７日	中東情勢に起因した資材の入手困難が判明し、入札公告取下げ
令和８年９月	資材入手確保の見通しを確認


２．整備内容

２５ｍプール	FRP 製プール槽及びプールサイドの改修
子どもプール	FRP 製プール槽及びプールサイドの改修、大型遊具の改修
その他	機械電気設備の改修など


３．今後の予定について

・中東情勢に起因した物価高騰による資材単価の上昇や、資材納期の延長に伴い工期が延びることなどにより、予算の見直しが必要。
・必要となる追加分の補正予算案を、令和８年１２月定例会へ提案予定。
・令和１０年度夏の営業再開を目指す。


黄檗公園プール【位置図】

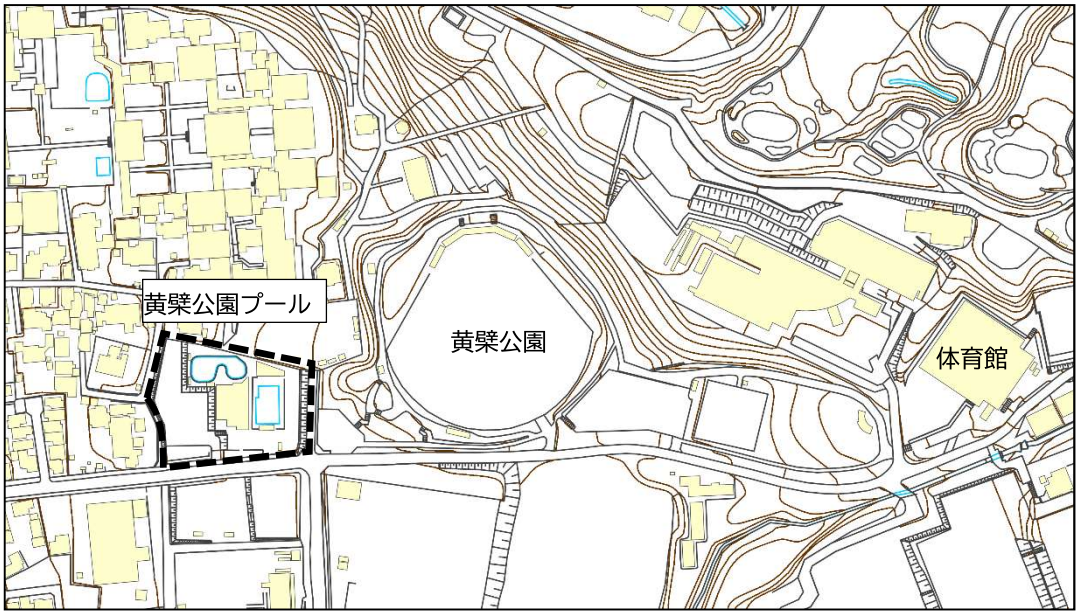

黄檗公園プール【現状平面図】

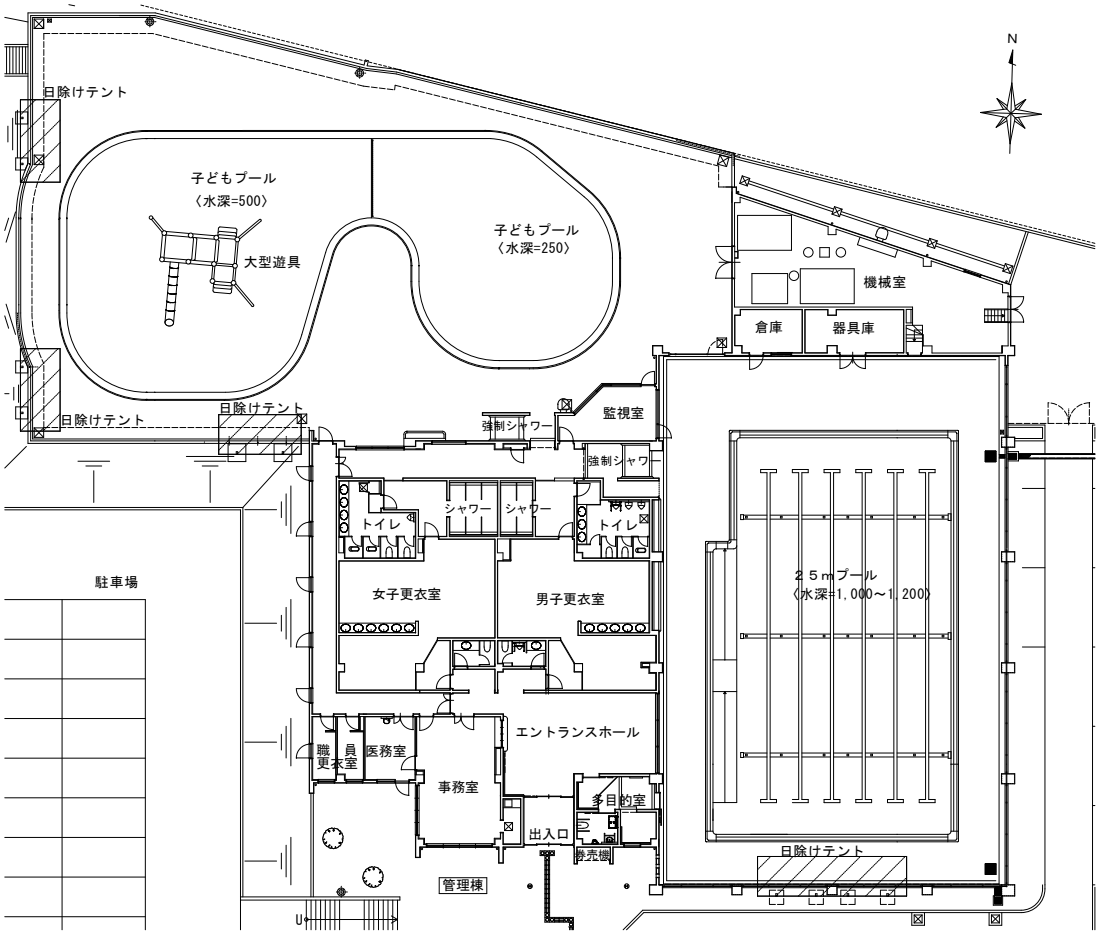

黄檗公園プール【計画平面図】

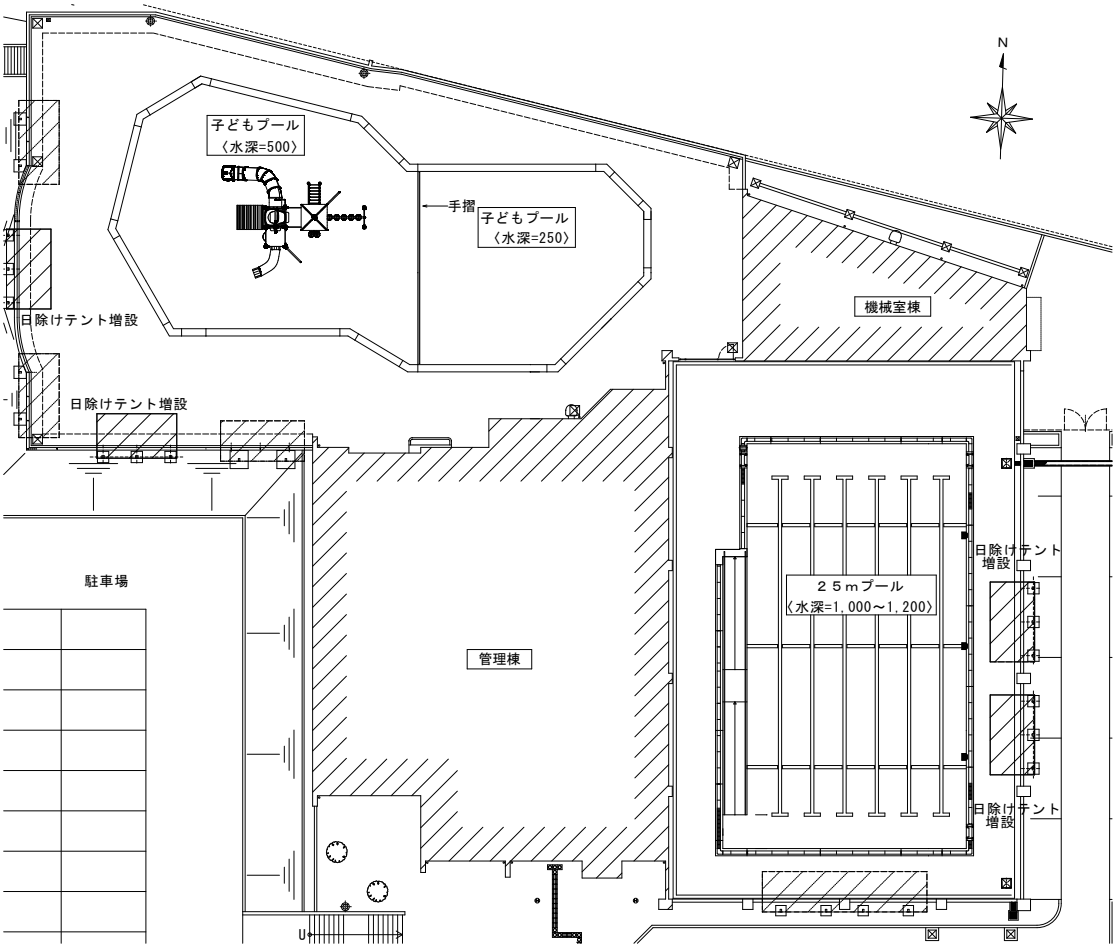

大型遊具　イメージ図

