工事週報 実施工程表 施工報告	令和 7年 6月 4日 ～ 令和 7年 6月 24日	作成: 令和 7年 6月 10日	設計監理	現場代理人	主任技術者
	(仮称)西小倉地域小中一貫校整備事業に伴う電気工事 【受注者】 八千代・村井特定建設工事共同企業体		橋本	有家	川村

施工場所	区分	工事週報(先週)							実施工程表(今週)							実施工程表(来週)							施工報告
	月／日	6.4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	※報告は一工程終了毎とする (確認内容も含めて記載する)。
	曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
校舎棟【躯体】	Ⅰ工区		RF	CON合番						CON合番													
	Ⅱ工区																						
	Ⅲ-①工区	CON合番																					
	Ⅲ-②③工区									RF	CON合番												
	Ⅳ工区													RF	CON合番								
	Ⅴ工区			RF			梁スリーブ									CON合番							
校舎棟【内装】	1階										LGS建込配管・配線						盤搬入						
	2階										LGS建込配管・配線												
アリーナ棟【躯体】	1工区																						
	2工区					M3F	建込配管										CON合番						
	3工区																						
	4工区																						
	5工区							3F	スラブ配管					CON合番									
アリーナ棟【内装】	1階				配線									LGS建込配管・配線									
会議・検査										◎○													総合定例【◎】、分科会【○】、検査【△】
騒音		小	小	小	小		小	小	小	小	小			小	小	小	小	小	小		小	小	騒音(一例) 小:充電ドライバー音等程度 中:音は気になるが会話可能程度 大:コンクリートはつり音等程度
振動		無	無	無	無		無	無	無	無	無			無	無	無	無	無	無		無	無	

【備考】

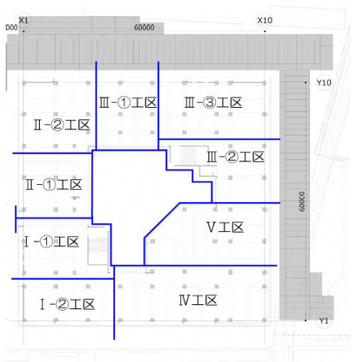

【校舎棟】躯体工区割

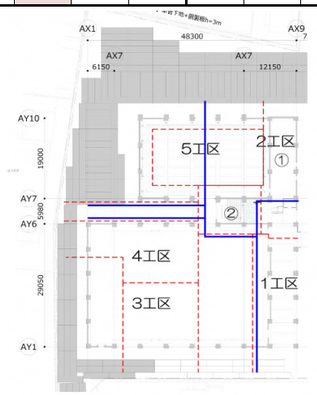

【アリーナ棟】躯体工区割

【記事】※検査項目等

上記の内容について確認したので報告します。

八千代・村井特定建設工事共同企業体

監理技術者 有家 正喜 有家
