様式－15　　○—○ … 機械設備工程　　○—○ … 建築工事工程　　No. 73

工事週報 実施工程表 施工報告	令和 7 年 6 月 18 日 ～ 令和 7 年 7 月 8 日 (仮称)西小倉地域小中一貫校整備事業に伴う機械工事 【アリーナ棟】 【受注者名】 扶桑管・ウチラ 特定建設工事共同企業体	作成： 令和7年6月25日	監理者	現場代理人 監理技術者	主任技術者

施工場所	区分	工事週報（実施報告）							実施工程表（今週）							実施工程表（来週）						
	年／月	令和7年6月														令和7年7月						
	日	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8
	曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
行事予定			災防協 建築JV							全体定例 分科会	安衛協 機械JV											
アリーナ棟（1工区） 躯体工事工程			M3階CON	墨出し					型枠建込／配筋								基礎CON			脱型		
アリーナ棟（2工区） 躯体工事工程							型枠建込／配筋										M3階CON			脱型		
							RGｽﾘｰﾌﾞ墨出し			RGｽﾘｰﾌﾞ取付							CON立会い					
アリーナ棟（3工区） 躯体工事工程												鉄骨段取り										
アリーナ棟（4工区） 躯体工事工程			M3階CON	墨出し	ｱﾝｶｰ取付		柱・壁・梁底 型枠					梁配筋				立上り型枠		4階CON			鉄骨段取り	
アリーナ棟（5工区） 躯体工事工程	5-1 5-2																					
	5-3						柱・壁・梁底 型枠			梁・ｽﾗﾌﾞ配筋				溝型枠など		3階CON	墨出し	庇鉄骨			型枠建込／配筋	
									墨出し	RGｽﾘｰﾌﾞ取付						CON立会い						
ｱﾘｰﾅ棟（1・3・4工区） 内部工事工程	1階工程	先行区画壁										壁LGS・ボード貼り										
										ウレタン吹付						LSD 取付		トロ詰め				
												LGS仕込配管										
		機器吊込	冷媒・ﾄﾞﾚﾝ配管（先行範囲）																			
			衛生天井配管・ダクト吊込み（先行範囲）																			
		ファン・ダクト吊込み （倉庫3）	ダクト保温						6/23～ 倉庫3 作業員詰所として使用													
			天井配管（倉庫3）																			
			ファン・ダクト吊込み （消火ポンプ室）				衛生天井配管（消火ポンプ室）			配管試験(仮)	配管・ﾀﾞｸﾄ保温											
ｱﾘｰﾅ棟（2工区） 内部工事工程	1階工程	先行区画壁										壁LGS・ボード貼り										
										ウレタン吹付						LSD 取付		トロ詰め				
												LGS仕込配管										
		機器吊込（ファン）					ダクト吊込（先行範囲）															
ｱﾘｰﾅ棟（5工区） 内部工事工程																						
その他		ﾀﾞﾝﾊﾟｰ類 搬入																				
騒音・振動 【大・中・小】（左）AM（右）PM																						
打合せ、検査										◎												
天気		○ ●	○	○ ◎	◎ ○	◎ ○	◎ ●	● ◎														

（凡例）　総合定例【◎】、分科会【○】、検査【△】　晴れ【○】、曇り【◎】、雨【●】、雪【＊】

施工報告書

※報告は一工程終了毎とする。
（確認内容も含めて記載する）

資料の有無

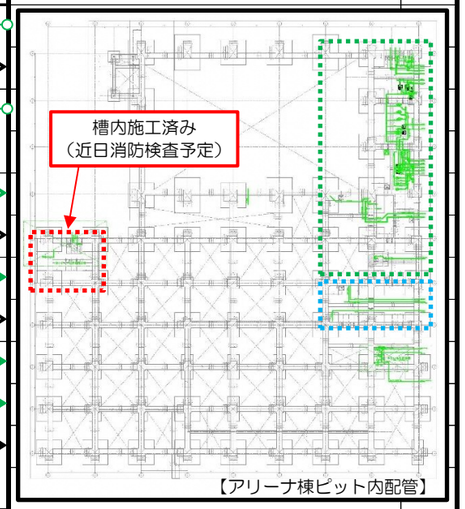

【アリーナ棟ピット内配管】

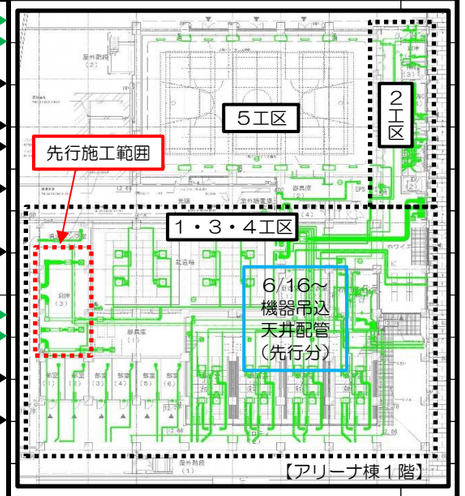

【アリーナ棟１階】

【記　事】※検査項目等記載

上記の内容について確認しましたので報告します。

扶桑管・ウチラ 特定建設工事共同企業体

監理技術者　佐 田　勝
