様式－15　　…機械設備工程　　…建築工事工程

No. 81

工事週報 実施工程表 施工報告

令和 7 年 8 月 20 日 ～ 令和 7 年 9 月 9 日　　作成： 令和7年8月27日

(仮称)西小倉地域小中一貫校整備事業に伴う機械工事 【校舎棟】

【受注者名】 扶桑管・ウチラ 特定建設工事共同企業体

監理者	現場代理人 監理技術者	主任技術者

区分 / 年／月 / 日 / 曜日 / 施工場所

工事週報（実施報告）：令和7年8月 20 21 22 23 24 25 26　水 木 金 土 日 月 火

実施工程表（今週）：令和7年8月 27 28 29 30 31　水 木 金 土 日

実施工程表（来週）：令和7年9月 1 2 3 4 5 6 7 8 9　月 火 水 木 金 土 日 月 火

行事予定

災防協 建築JV（21）

全体定例 分科会（28）　安衛協 機械JV（29）

校舎棟（A・B工区）西・南 躯体工事工程

- 屋根工事（21～26）
- ALC・ハト小屋 塗装（29～31）
- 軒天下地・ボード貼（6～7）

校舎棟（C・D工区）東・北 躯体工事工程

- 屋根工事（24～31）
- ALC・ハト小屋 塗装（6～7）

校舎棟（1・2工区）内部工事工程

1階工程
- 壁塗装（31）

2階工程
- WCﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ（21～22）
- 天井下地・ボード貼り（校舎棟1・2工区 各室）（29～7）

3階工程
- 壁LGS・GL・ボード貼り（21～28）
- 天井下地・ボード貼り（校舎棟1・2工区 各室）（2～7）
- LGS仕込配管・配線（21～28）
- 衛生天井配管（WC-2）（21～28）
- 配管立上げ（WC-2）（28～31）
- 配管試験(仮)（30～31）
- 衛生配管保温（2～4）
- 衛生配管保温（21～22）
- 冷媒・ﾄﾞﾚﾝ配管（音楽室1・2、音楽準備室）（24～26）
- 気密試験(仮)（25～26）
- ダクト保温（28～29）
- ダクト保温（21～22）
- ダクト吊込（音楽室2）（22～23）
- ﾀﾞｸﾄ吊込（職員更衣・休憩室、更衣室、相談室、教員庫）（23～26）
- ダクト吊込（WC-2）（4～5）
- 同左保温（5～7）

4階工程
- 先行区画壁 LGS／ﾎﾞｰﾄﾞ（29～7）
- SD取付（21～26）
- ウレタン吹付（28～30）
- ウレタン吹付（5～7）
- LGS仕込配管（先行LGS対応）（29～7）
- 冷媒・ﾄﾞﾚﾝ配管（普通教室7(1)～(4)）（31～4）
- 気密試験(仮)（4～5）
- 冷媒・ﾄﾞﾚﾝ配管（理科室(1)、理科準備室(2)）（5～7）
- ダクト保温（7～8）
- ダクト吊込（普通教室7(1)～(4)）（5～7）
- ダクト吊込（理科室など）（7～8）

校舎棟（3～5工区）内部工事工程

1階工程
- 天井下地・ボード貼り（校舎棟3～5工区 各室）（21～24）
- 壁塗装（31）

2階工程
- 天井下地・ボード貼り（校舎棟3～5工区 各室）（29～7）

3階工程
- 壁LGS・GL・ボード貼り（21～29）
- 天井下地・ボード貼り（校舎棟3～5工区 各室）（5～7）
- LGS仕込配管・配線（28～5）
- 衛生天井配管（調理室、家庭科準備室、被覆室）（24～25）
- 配管試験(仮)（25～26）
- 同左配管保温（26～29）
- 衛生天井配管（WC-1）（26～4）
- 配管立上げ（WC-1）（4～7）
- 配管試験(仮)（7～8）
- 保温（8～9）
- 冷媒・ﾄﾞﾚﾝ配管（普通教室5(1)～(4)）（25～28）
- 気密試験(仮)（28～29）
- 冷媒・ﾄﾞﾚﾝ配管（普通教室6(1)～(4)）（29～4）
- 気密試験(仮)（4～5）
- 冷媒・ﾄﾞﾚﾝ配管（調理室、家庭科準備室、被覆室）（5～7）
- 気密試験(仮)（7～8）
- ダクト吊込（普通教室5(1)～(4)）（普通教室6(1)～(4)）（28～4）
- ダクト吊込（調理室、家庭科準備室、被覆室）（4～9）
- ダクト保温（普通教室5(1)～(4)）（普通教室6(1)～(4)）（29～5）

4階工程
- 先行区画壁 LGS／ﾎﾞｰﾄﾞ（29～7）
- SD取付（21～26）
- ウレタン吹付（28～30）
- ウレタン吹付（5～7）
- LGS仕込配管（先行LGS対応）（29～7）
- 機器吊込（GHP室内機・ﾛｽﾅｲ・ﾌｧﾝ）（24～31）

搬入、その他

騒音・振動

【大・中・小】（左）AM（右）PM

	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9
打合せ、検査									◎												
天気	○	○	◎	○	◎	○	◎	○	◎	○	○	◎									

（凡例）　総合定例【◎】、分科会【○】、検査【△】　　晴れ【○】、曇り【◎】、雨【●】、雪【＊】

施工報告書

※報告は一工程終了毎とする。（確認内容も含めて記載する）

資料の有無

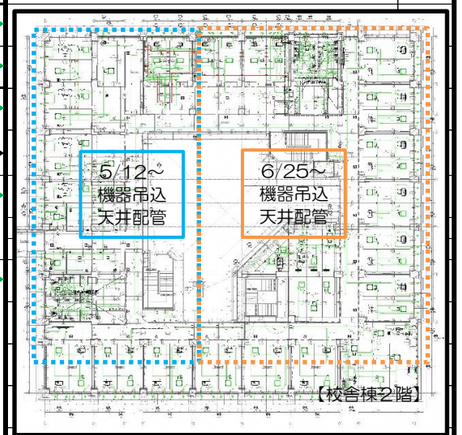

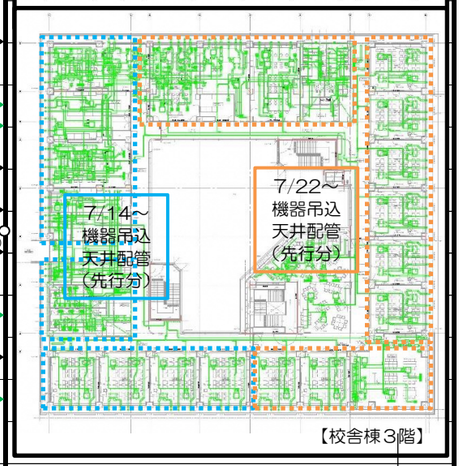

【記　事】※検査項目等記載

上記の内容について確認しましたので報告します。

扶桑管・ウチラ 特定建設工事共同企業体

監理技術者　佐田　勝
