工事週報
実施工程表
施工報告

令和 7年 8月 20日 ～ 令和 8年 9月 9日

作成：令和 7年 8月 26日

（仮称）西小倉地域小中一貫校整備事業に伴う電気工事

	設計監理	現場代理人	主任技術者
	橋本	有家	川村

施工場所	区分	工事週報（先週）							実施工程表（今週）							実施工程表（来週）							施工報告
	月／日	8.20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	9.1	2	3	4	5	6	7	8	9	※報告は一工程終了毎とする（確認内容も含めて記載する）。
	曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
校舎棟	R階							パワコン架台										太陽光パネル（南側）					
	4階 Ⅰ・Ⅱ工区										配線・壁仕込み												
	4階 Ⅲ～Ⅴ工区										配線・壁仕込み												
	3階 Ⅰ・Ⅱ工区										天井内仕込み												
	3階 Ⅲ～Ⅴ工区										天井内仕込み												
	2階 Ⅰ・Ⅱ工区			天井内仕込み											天井内仕込み/天井器具付け								
	2階 Ⅲ～Ⅴ工区			天井内仕込み											天井内仕込み/天井器具付け								
	1階 Ⅰ・Ⅱ工区					天井内仕込み/天井器具付け											天井内仕込み/天井・壁器具付け						
	1階 Ⅲ～Ⅴ工区					天井内仕込み/天井器具付け											天井内仕込み/天井・壁器具付け						
アリーナ棟	R階																						
	3階									壁仕込み										配線			
	2階 Ⅰ・Ⅱ工区 大アリーナ									壁仕込み/縦ラック										配線			
	1階 Ⅰ・Ⅱ工区 小アリーナ	配線									天井内仕込み												
外構																							
会議・検査										◎○													総合定例【◎】、分科会【○】、検査【△】
騒音		小	小	小	小		小	小	小	小	小	小		小	小	小	小	小	小		小	小	騒音（一例） 小：充電ドライバー音等程度 中：音は気になるが会話可能程度 大：コンクリートはつり音等程度
振動		無	無	無	無		無	無	無	無	無	無		無	無	無	無	無	無		無	無	

【備考】

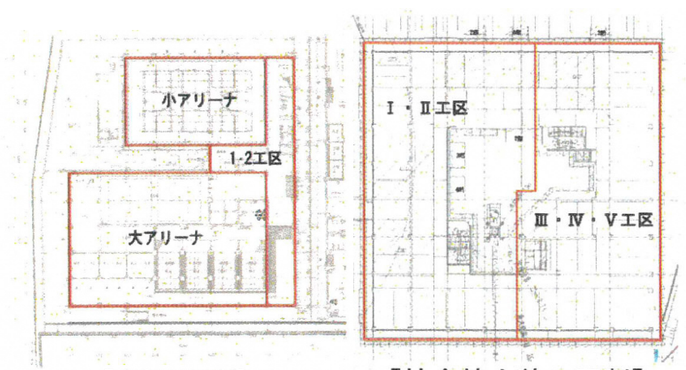

【内部工区割】　【校舎棟内装工区割】

【記事】※検査項目等

上記の内容について確認したので報告します。

八千代・村井特定建設工事共同企業体

監理技術者　有家　正喜　有家
