様式-19(公共建築工事標準書式)

工 事 週 報
実 施 工 程 表
施 工 報 告

令和7年8月20日～令和7年9月9日

作成日：令和7年8月25日

(仮称)西小倉地域小中一貫校整備事業に伴う建築工事

【受注者名】　東洋・田中健特定建設工事共同企業体

設計監理	現場代理人	監理技術者	主任技術者
田野	佐伯	大畑	西村

区 分			工 事 週 報(先週)							実施工程表(今週)							実施工程表(来週)						
施工場所		月	8月												9月								
		日	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		曜 日	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)
準備工・仮設工事								足場盛替 ACW付近															
								足場盛替 小アリーナ															
校舎棟 屋上工事		A・B工区	屋根工事						(ALC・ハト小屋) 塗装								軒天下地・ﾎﾞｰﾄﾞ						
		C・D工区	屋根工事														(ALC・ハト小屋) 塗装						
校舎棟 外装工事			外壁塗装 3階																				
											塗膜防水 2階 西・南							塗膜防水 2階 東・北					
校舎棟 内装工事	1階	Ⅰ・Ⅱ工区	壁塗装																				
		Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ工区	壁塗装																				
			天井ﾎﾞｰﾄﾞ																				
	2階	Ⅰ・Ⅱ工区	WC	レベリング																			
			天井下地組・ﾎﾞｰﾄﾞ・壁塗装																				
		Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ工区	天井下地組・ﾎﾞｰﾄﾞ・壁塗装																				
	3階	Ⅰ・Ⅱ工区	LGS/ﾎﾞｰﾄﾞ貼/カーテンボックス							天井下地組・ﾎﾞｰﾄﾞ・壁塗装													
		Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ工区	LGS/ﾎﾞｰﾄﾞ貼/カーテンボックス										天井下地組・ﾎﾞｰﾄﾞ・壁塗装										
	4階	Ⅰ・Ⅱ工区	SD					ウレタン吹											ウレタン吹				
			額縁/LGS/ﾎﾞｰﾄﾞ貼																				
		Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ工区	SD					ウレタン吹											ウレタン吹				
			額縁/LGS/ﾎﾞｰﾄﾞ貼																				
アリーナ棟 屋上・躯体工事		2工区	アスファルト防水					伸縮目地			ワイヤーメッシュ敷					嵩上げCON				塗膜防水			
		1工区	アスファルト防水					伸縮目地			ワイヤーメッシュ敷					嵩上げCON	左官補修			塗膜防水			
		大アリーナ	鉄骨建方																				
		小アリーナ	伸縮目地			ワイヤーメッシュ敷						嵩上げCON 東ｹﾞｰﾄ使用	墨出			別途配管							
アリーナ棟 内装工事			ウレタン吹付 1階・2階					足場盛替															
			額縁/LGS/ﾎﾞｰﾄﾞ貼																				
渡り廊下			配筋	型枠建込					CON 3階立上り						型枠解体		躯体調整						
警備員予定			警備員1名+2名(常駐)																				
ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ/生ｺﾝﾎﾟﾝﾌﾟ予定 10tﾀﾞﾝﾌﾟ、生ｺﾝ車台数は上記に記載				25ｔＲＣ					25ｔＲＣ		25ｔＲＣ	25ｔＲＣ					25ｔＲＣ	25ｔＲＣ					
									4ｔＰ			4ｔＰ				4ｔＰ							
東門通行車両 原則、通学時間8:00～8:45は通行不可			7台	7台	7台	11台		7台	7台	11台	7台	19台	9台		7台	13台	7台	7台	13台	13台		7台	7台
騒音・振動			中	中	中	中		中	大	中	中	大	中		中	大	中	中	中	中		中	中
各行事予定 打合せ○　検査△　事前調査※			一斉清掃 週間工程							一斉清掃 週間工程	定例会議						一斉清掃 週間工程						

天気	○ 晴	◎ 曇	● 雨	＊ 雪	○ 晴	○ 晴	○ 晴	○ 晴	○ 晴	○ 晴	○ 晴

【備　考】

中学校
8月27日　始業式

幼稚園
9月1日　始業式

※BHはﾊﾞｯｸﾎｳを示す
※TCはﾀﾜｰｸﾚｰﾝを示す
※CCはｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝを示す
※Pは生ｺﾝﾎﾟﾝﾌﾟ車を示す
※RCはﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝを示す

記　　事
(検査項目等記載)

・8/25　渡り廊下配筋検査(打設前)

施 工 報 告

※報告は一工程終了毎とする。
(確認内容も含めて記載する。)

<お知らせ>
【8月1日～11月頃】
アスファルト防水施工の為、
アスファルト特有の匂いが発生します。

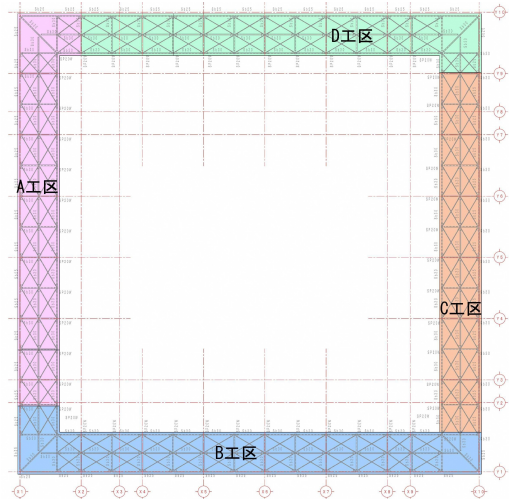

【校舎棟】屋上工区割

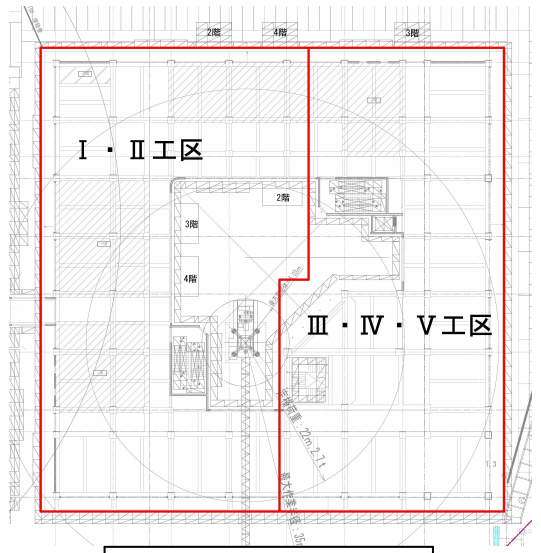

【校舎棟】内装工区割

- - - ：CON打設工区（2Fスラブ）
— ：CON打設工区（3Fスラブ）



【ｱﾘｰﾅ棟】躯体工区割

上記の内容について確認したので報告します。

監理技術者
氏　名　　大畑　勝弘　（大畑）
