様式－15　　…機械設備工程　　…建築工事工程

No. 81

工事週報 実施工程表 施工報告

令和 7 年 8 月 20 日 ～ 令和 7 年 9 月 9 日　　作成： 令和7年8月27日

(仮称)西小倉地域小中一貫校整備事業に伴う機械工事 【アリーナ棟、ほか】

【受注者名】 扶桑管・ウチラ 特定建設工事共同企業体

監理者	現場代理人 監理技術者	主任技術者

区分	工事週報（実施報告）							実施工程表（今週）							実施工程表（来週）								
年／月	令和7年8月													令和7年9月									
日	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9
施工場所 曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
行事予定		災防協 建築JV							全体定例 分科会	安衛協 機械JV											
アリーナ棟（1工区）躯体工事工程	アスファルト防水						伸縮目地			ワイヤーメッシュ敷設				嵩上げCON		左官補修				塗膜防水	
アリーナ棟（2工区）躯体工事工程	アスファルト防水						伸縮目地			ワイヤーメッシュ敷設				嵩上げCON						塗膜防水	
アリーナ棟（大アリーナ）躯体工事工程											鉄骨建方										
アリーナ棟（小アリーナ）躯体工事工程		伸縮目地				ワイヤーメッシュ敷設				嵩上げCON		墨出し									
アリーナ棟（1・3・4工区）内部工事工程 1階工程										天井下地、天井下壁LGS											
											LGS仕込配管										
	建具ﾁｬﾝﾊﾞｰ接続・ﾀﾞｸﾄ保温																				
アリーナ棟（2工区）内部工事工程 1階工程													天井下地、天井下壁LGS								
	配管立上げ（WC-3）	配管試験(仮)	衛生配管保温																		
		ダクト吊込（WC-3）	ダクト保温																		
アリーナ棟（1・2工区）内部工事工程 2階工程											先行 壁ボード貼り										
											ガス立管（PS1）		消火立管（PS1）						冷媒・ドレン立管（PS1）		
													機器・ダクト吊込		ダクト保温				冷媒天井配管（大アリーナ系統）		
3階工程	先行 壁LGS・ﾎﾞｰﾄﾞ貼		ウレタン吹付（1工区）										先行 壁ボード貼り								
	ｳﾚﾀﾝ対応作業																				
アリーナ棟（小アリーナ工区）内部工事工程 1階工程																				天井下地	
										GHP室内機吊込、冷媒・ドレン配管、リモコン配線、端部保温補修											
									エアー搬送ファン吊込												
2階工程	ウレタン吹付					足場盛替							LGS下地						木下地		
									FAN・ﾀﾞｸﾄ吊込、保温（外装色：黒資材使用）												
アリーナ棟（大アリーナ工区）内部工事工程																					
屋外工事																					
その他							北側道路 本復旧作業														
	機器搬入(小アリーナ分) エアー搬送ﾌｧﾝ・中間FAN				機器搬入(小アリーナ分) GHP室内機								機器搬入 中間FAN（2階分）								
騒音・振動 【大・中・小】（左）AM（右）PM																					
打合せ、検査									◎												
天気	○	○ ◎	○	◎ ○	◎ ○	◎ ○	○ ◎														

（凡例）　総合定例【◎】、分科会【○】、検査【△】　　晴れ【○】、曇り【◎】、雨【●】、雪【＊】

施工報告書

※報告は一工程終了毎とする。（確認内容も含めて記載する）

資料の有無

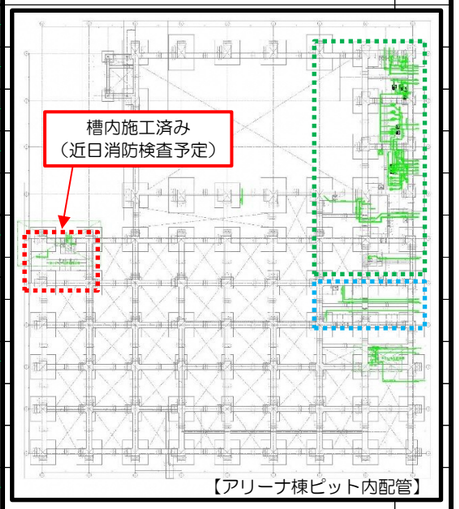

【アリーナ棟ピット内配管】

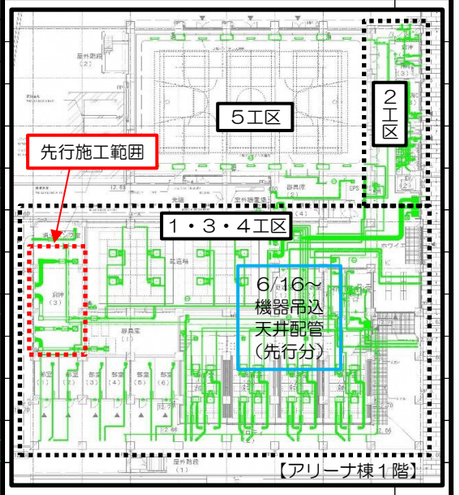

【アリーナ棟１階】

【記　事】※検査項目等記載

上記の内容について確認しましたので報告します。

扶桑管・ウチラ 特定建設工事共同企業体

監理技術者　佐田　勝
