様式－15

…機械設備工程　…建築工事工程

No. 89

工事週報 実施工程表 施工報告	令和 7 年 10 月 15 日 ～ 令和 7 年 11 月 4 日	作成： 令和7年10月22日	監理者	現場代理人 監理技術者	主任技術者
	(仮称)西小倉地域小中一貫校整備事業に伴う機械工事	【受注者名】 扶桑管・ウチラ 特定建設工事共同企業体			

区分 / 年／月 / 日 / 施工場所 / 曜日

工事週報（実施報告）　実施工程表（今週）　実施工程表（来週）

令和７年１０月　令和７年１１月

15 水　16 木　17 金　18 土　19 日　20 月　21 火　22 水　23 木　24 金　25 土　26 日　27 月　28 火　29 水　30 木　31 金　1 土　2 日　3 月　4 火

行事予定：災防協 建築JV　工場検査 濾過ﾕﾆｯﾄ　全体定例 分科会　工場検査 受水槽　安衛協 機械JV　安全大会

校舎棟 屋上工事工程：ｼﾝｸﾞｰCON4　設備架台鉄骨　同左 本締め　ｷｭｰﾋﾞｸﾙ搬入　校舎棟 屋上 機器搬入据付

校舎棟（１～４工区）内部工事工程：各階 各種内装仕上げ作業　各階 天井ﾊﾟﾈﾙ・制気口、壁ﾘﾓｺﾝ取付

校舎棟（５工区）交流ﾎｰﾙ・ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ 工事工程：各階内装工程（天井内区画ﾎﾞｰﾄﾞ貼 ⇒ 別途天井内工事 ⇒ 天井下地／ﾎﾞｰﾄﾞ貼）　４階 機器類吊込、配管　保温仕舞い　３階 機器類吊込、冷媒・ﾄﾞﾚﾝ配管　保温仕舞い　２階 機器類吊込、冷媒・ﾄﾞﾚﾝ配管　保温仕舞い　１階 機器類吊込、冷媒・ﾄﾞﾚﾝ配管　保温仕舞い

アリーナ棟 屋上工事工程：11/6 機器搬入・据付

ｱﾘｰﾅ棟（１～４工区）内部工事工程　１階工程：壁・天井ボード貼り（ホワイエ・更衣室・倉庫４）　壁塗装　タイル下地（WC）　天井下地（武道場）　天井ボード貼り（武道場）　壁・天井 杉板貼り（武道場）　軒天井 下地／ボード貼（ピロティ）　詰所で仮使用（部室１～６、倉庫３）　ドレン天井配管（ピロティ）　ダクト吊込（ピロティ）　ダクト保温（ピロティ）

ｱﾘｰﾅ棟（１・２工区）内部工事工程　２階工程：天井ボード貼り（ホワイエ）　壁塗装（ホワイエ）　壁・天井ボード貼り（WC）　資材置場として仮使用（器具庫）　濾過機械室 GW貼　濾過機械室 高所配管、ダクト吊込み　配管試験（仮）　同左 保温

３階工程：天井・壁下地／ボード貼り（廊下、部室１～６）　ＧＬボード貼（更衣室３・４、器具庫、廊下）　壁・天井ボード貼り（更衣室３・４、器具庫、廊下）　壁塗装　天井・壁下地（WC）　壁・天井ボード貼り（WC）　資材置場として仮使用（倉庫２）

ｱﾘｰﾅ棟（小ｱﾘｰﾅ工区）内部工事工程

ｱﾘｰﾅ棟（大ｱﾘｰﾅ工区）内部工事工程：屋根工事　2F ｳﾚﾀﾝ吹付　空調機器吊込　冷媒・ﾄﾞﾚﾝ配管（北）　冷媒・ﾄﾞﾚﾝ配管（南）　配線等（南）　配線等（北）　2F ｴｱｰ搬送ﾌｧﾝ吊込　4F ﾌｧﾝ吊込　ALC開口作業　4F ﾀﾞｸﾄ吊込

プール（プールピットとも）：プール・シャワーユニット据付　プールピット内先行配管　各種配管 プール接続

屋外工事　農具庫・ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ：壁型枠　壁配筋　返し型枠　CON打設　CON立会い　型枠解体　足場解体　屋根鉄骨　壁ｽﾘｰﾌﾞ取付

受水槽まわり：地盤改良・掘削　捨CON　墨出し、配筋・型枠　基礎CON　先行配管 受水槽系統

搬入、その他：機器搬入 大ｱﾘｰﾅ　室外機搬入

騒音・振動【大・中・小】（左）AM（右）PM

打合せ、検査			△						◎					△					
天気	◎	○	◎	●	○	●	○	◎	●	◎	○	◎							

（凡例）　総合定例【◎】、分科会【○】、検査【△】　晴れ【○】、曇り【◎】、雨【●】、雪【＊】

施工報告書

※報告は一工程終了毎とする。
（確認内容も含めて記載する）

資料の有無

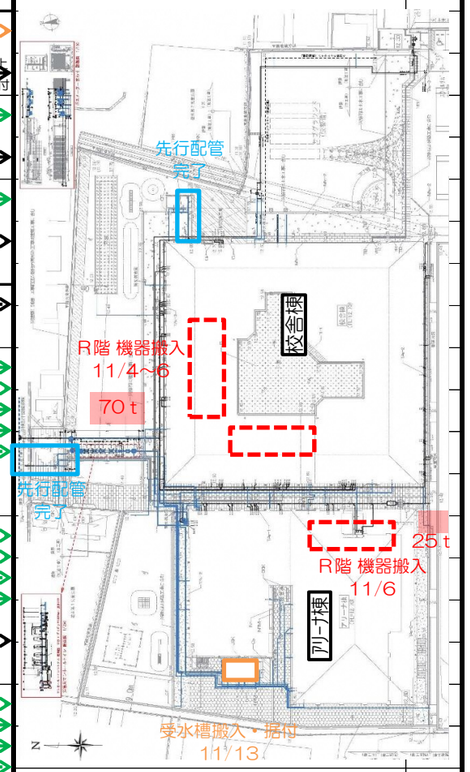

【記　事】※検査項目等記載

上記の内容について確認しましたので報告します。

扶桑管・ウチラ 特定建設工事共同企業体

監理技術者　佐田　勝
