


第 2 期歴史的風致維持向上計画策定スケジュール
及び 工程表（案）

第2期歴史的風致維持向上計画策定スケジュール(案)

1. 進行管理・評価の概要

・進捗評価	： 施策・事業の進捗状況(アウトプット)の評価【自己評価】
・中間・最終評価	： 歴史的風致の維持向上等の評価【自己評価・外部評価】 『計画に基づく方針』『波及効果』『代表的な事業の質』『歴史的風致』など

～ 進行管理・評価のイメージ～

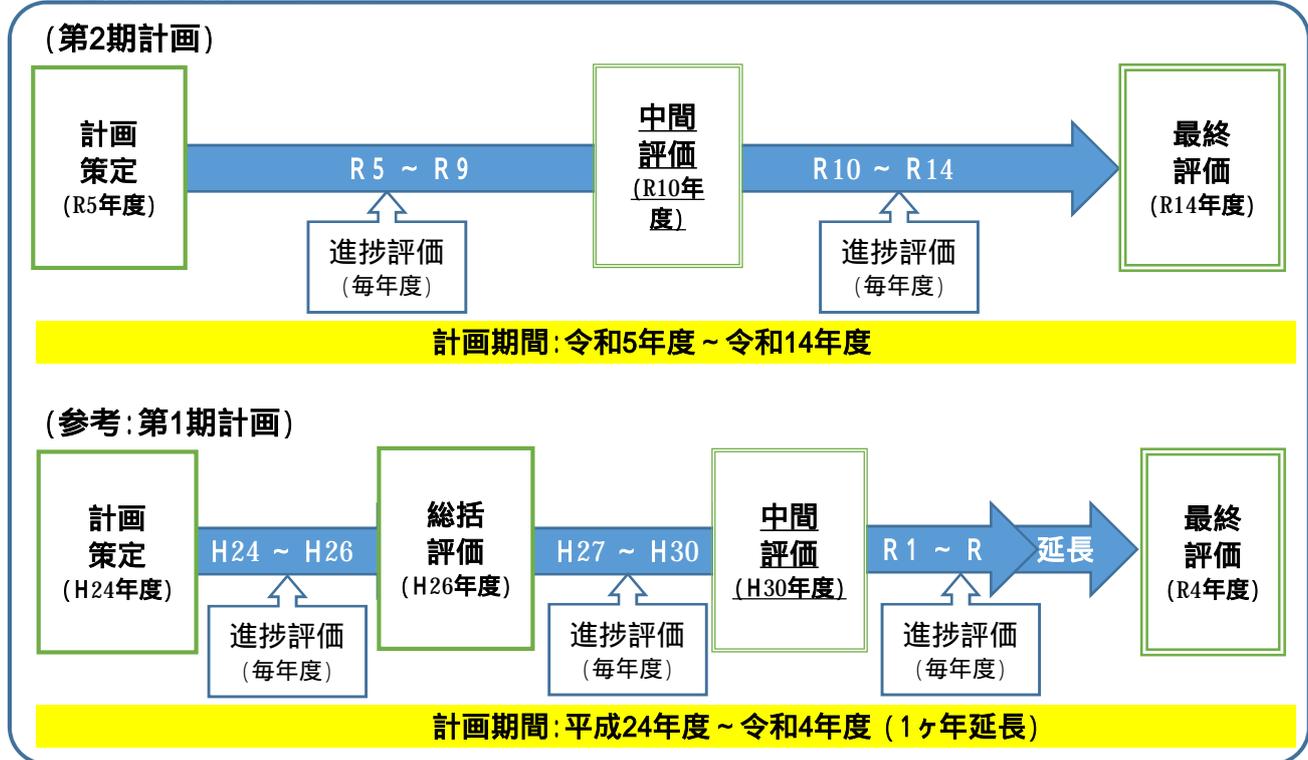

平成29年度以降の評価手法の変更点

3年ごとの「総括評価」は廃止 計画期間の中間時点で「中間評価」、最終年度に「最終評価」を実施

2. 最終評価及び2期計画策定の作業スケジュール(予定)

(詳細は別紙工程表を参照。)

令和4年	6月	第1回協議会開催(本日) (第2期計画の方針・スケジュールについて協議)
	7月	国ヒアリング開始(第1期評価、第2期計画)
	9月	国ヒアリング2回目(第2期計画)
	10月	第2回協議会の開催 (第1期評価、第2期計画、パブリックコメント概要協議等)
	11月	パブリックコメントの実施
令和5年	1月	第3回協議会の開催(パブリックコメントの結果報告)
	2月	国に申請及び提出(第1期評価及び第2期計画) 第2期計画の認定 (3月)
	4月	宇治市ホームページに掲載して公表(第1期評価及び第2期計画)

工程表 第2期歴史的風致維持向上計画策定スケジュール(案)

年 月	R4												R5			備考	
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6		
計画期間	第1期												第2期				
委員委嘱関係	任期(R2.4.1-R5.3.31)																
国作業スケジュール <small>国協議は別途調整により時期の変更が可能。</small>	作成作業												国と調整				
				三省協議 全章		三省協議 全章		三省協議 全章		最終(案)	申請	認定	市HPに掲載し公表				
【最終評価】 事前検討 計画(素案)作成 計画(案)作成	パブコメ																
【第2期計画】 個別事業 評価(素案)作成 評価(案)作成	初案			パブコメ						運用開始							
庁内調整会議																	
歴まち協議会	R3進捗報告 2期策定スケジュール・方針			2期素案・1期評価(案)			(案)提出前最終										
まちづくり審議会・文化財保護委員会等																	
パブリックコメント													パブコメ				
議会													(案)・パブコメ概要			(案)・パブコメ結果	完成報告
